



Àrea: : Alcaldia
Departament : Gerència
Expedient : X2024000008
Pla d'acció municipal 2023-2027.
Destinació : Alcalde
Assumpte : Informe-memòria d'avaluació del PAM a 31 de desembre de 2025

Relació de fets

La Junta de govern local, en sessió celebrada el 18 de gener de 2024, va aprovar el Pla d'acció municipal per al període 2023-2027.

En el seu apartat "Seguiment, revisió i avaluació", el Pla determina el següent:

2) Avaluació. Anualment es farà una avaluació de l'estat d'execució del PAM, basada en els resultats de seguiment recollits a inicis de cada exercici. La Gerència municipal prepararà una memòria d'avaluació que serà disponible el mes de març de cada any i que inclourà:

a) Dades significatives sobre l'execució del PAM.

b) Anàlisi dels resultats obtinguts.



c) Valoració i proposta de modificacions en els objectius o les accions destacades. La memòria es presentarà a l'Alcaldia i la Junta de Govern Local per a la seva aprovació, se'n donarà compte al Ple i es publicarà al portal de transparència de l'Ajuntament.

Tenint això en compte, durant els mesos de febrer i març de 2026 s'ha dut a terme des de la Gerència municipal el procés de recollida de la informació sobre l'execució de les accions programades durant l'any 2025, subministrada pels diferents àmbits gestors, i s'ha elaborat la present Memòria, que ha estat revisada per les regidories i àmbits organitzatius responsables de cada acció, els quals n'han pogut fer comentaris i observacions.

Dades significatives sobre l'execució del Pla

A data 31 de desembre de 2025, les dades resum del Pla, per al conjunt de l'Ajuntament del Masnou, són les següents:

Accions	Nombre	%
Planificades	205	
Cancel·lades	6	2,93%
Programades per 2025 i no cancel·lades	172	83,90%
Iniciades	154	89,53%
Programades i no iniciades a 31/12/2025	18	10,47%
Accions avançades a l'inici programat	8	3,90%
Accions completades a 31/12/2025	29	16,86%

Estat d'execució a 31/12/2024		
Previst	Real	Valoració
57,74%	46,34%	↔
		

L'estat d'execució real del conjunt de les accions programades per 2025 és d'un 46,34%, deu punts percentuals per sota de la previsió (57,74%). La desviació es troba al voltant del 10%, però a la data de referència es pot dir que el Pla havia arribat aproximadament al 50% de l'execució.

Es considera que el grau d'execució és acceptable i que moltes de les accions endarrerides s'executaran al llarg de l'any 2026. No obstant, algunes accions han trobat dificultats per la seva execució i hauran de ser replantejades.

Tot seguit es presenta un resum de les dades d'execució, per regidories:

Regidoria	Accions planificades	Execució prevista	Execució real	Valoració
Alcaldia	21	50,43%	44,05%	↔
Modernització i atenció ciutadana	5	67,40%	65,40%	↔
Seguretat ciutadana	6	48,50%	55,67%	↑
Promoció econòmica i turisme	9	54,78%	56,33%	↑
Acció cívica i festes	1	100,00%	100,00%	↑
Acció social	7	50,29%	66,71%	↑
Educació	9	55,33%	61,78%	↑
Esports	10	79,50%	59,50%	↔
Gent gran	2	20,00%	37,50%	↑
Igualtat	4	76,50%	47,25%	↓
Infància i joventut	6	53,50%	45,17%	↔
Benestar animal, salut pública i consum	7	56,57%	56,57%	↑
Salut comunitària	7	67,43%	58,86%	↔
Solidaritat i cooperació	4	74,25%	74,25%	↑
Accessibilitat i diversitat funcional	3	54,00%	54,00%	↑
Transició ecològica i desenvolupament sostenible	21	51,86%	40,19%	↔
Mobilitat i via pública	15	66,47%	60,47%	↔
Urbanisme i obres	43	58,02%	24,35%	↓
Serveis urbans i manteniment	18	51,17%	32,06%	↓
Habitatge	7	59,29%	73,00%	↑

Anàlisi dels resultats obtinguts

En document complementari s'adjunta l'informe amb l'estat d'execució detallat de les accions del PAM per regidories i per programes d'actuació.

Proposta de modificacions en els objectius o les accions destacades

Tenint en compte l'anàlisi de cadascuna de les accions planificades i l'estat d'execució a 31 de desembre de 2025, es proposen les següents modificacions al Pla:

Núm.	Acció	Modificació
014	Actualitzar el protocol que reculli les actuacions col·laboratives que es desenvolupen entre les escoles bressol municipals i el Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP).	Es canvia el títol de l'acció, que era "Elaborar un protocol [...]", per "Actualitzar el protocol [...]", perquè ja n'existia un.
021	Subvencionar la realització de proves per detectar l'existència de gas radó a les llars.	Es canvia la regidoria participant, que és Urbanisme i obres, no Transició ecològica. Així mateix, s'avança dos mesos la data d'acabament de l'acció, a abril de 2027.
097	Desenvolupar un pla urbanístic de la façana marítima.	Es proposa la cancel·lació de l'acció ja que no es considera viable en el seu plantejament original.
102	Impulsar en el transport de bus nocturn la parada a demanda, i així poder baixar dintre del recorregut el més a prop de casa.	Es proposa la cancel·lació de l'acció ja que no es considera viable en el seu plantejament original.
131	Continuar oferint programes d'aprenentatge, ocupació i inserció laboral per al jovent, com «Primeres oportunitats», Formació Professional Dual i similars.	A proposta de la regidoria d'Educació es cancel·la aquesta acció, ja que es fusiona amb la número 140, tenint en compte que l'objecte és concurrent.
149	Renovar la il·luminació de Nadal, especialment la dels trams de carrers que formin part d'eixos comercials.	S'allarga el termini d'execució fins Nadal de 2027.
150	Dinamitzar els eixos comercials de la Vila, amb especial atenció als existents fora del centre.	S'avança el termini d'execució fins el 31/12/2026, que és quan es preveu que finalitzarà l'acció.
156	Elaborar un pla estratègic per a la consecució de l'agenda urbana 2030.	Les actuacions en relació amb aquesta acció s'han centrat en el projecte d'elaboració del nou Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS), en el qual es concretaran estratègies pròpies de l'agenda urbana 2030. Es preveu les tasques d'elaboració del PMUS que ha de dur a terme l'Ajuntament hauran acabat a finals de 2026.
157	Implantar la figura del regidor o regidora i dels consells de barri.	L'àmbit gestor proposa la cancel·lació de l'acció, ateses les dificultats per la seva execució en el tram final del mandat.
163	Fer una vegada a l'any la Fira de Benestar Animal on l'Ajuntament donarà veu a les entitats que vetllen i treballen pel benestar animal.	S'allarga un mes la data final d'execució, fins novembre de 2026 (la segona edició de la Fira es va fer el dia 9 de novembre de 2025).
168	Potenciar la figura dels agents cívics i incrementar-ne el seu nombre.	Donat que a l'organigrama vigent els agents cívics depenen de l'àmbit de Territori i de la regidoria de Serveis urbans i manteniment, es modifiquen les responsabilitats de l'actuació i el programa de referència en aquest sentit.
181	Eliminar progressivament les barreres arquitectòniques al voltant de la plaça de Ramón y Cajal i del carrer de Pau Casals.	Es proposa la cancel·lació de l'acció ja que no es considera significativa en la seva formulació inicial.
189	Estudiar la necessitat de crear àrees d'estacionament per a motocicletes i regular el seu ús, durant l'època estival.	Tot i haver estat completada, es canvia l'àmbit responsable a Mobilitat i via pública, restant Seguretat Ciutadana com a regidoria col·laboradora.

Conclusions

Les principals conclusions sobre l'execució del Pla a 31 de desembre de 2025 són les següents:

- 1) Al tancament de l'any 2025 havien d'estar en marxa 172 de les 205 accions incloses en el Pla. La realitat és que s'han iniciat 154 accions (89,53%), un nombre inferior al previst però que es considera acceptable atenent les circumstàncies d'execució concreta de cada acció, especialment aquelles que depenen de la intervenció d'instàncies externes al propi Ajuntament.

8 accions s'han posat en marxa abans del previst, però 18 estan pendents d'inici tot i haver estat aquest previst per 2025.

S'han completat 29 accions a 31 de desembre de 2025 (16,86%).

- 2) Per tant, des del punt de vista de la programació temporal, es conclou que el Pla està sent seguit pel conjunt de les regidories i dels àmbits organitzatius gestors amb un bon nivell de resultat. Com ja s'ha assenyalat, es considera que les regidories que estan tenint un major endarreriment en la materialització de les accions de les quals en són responsables es veuen penalitzades pel fet que en molts casos la tramitació o l'execució depèn de factors externs al propi Ajuntament.
- 3) Des de l'òptica de l'execució material, l'estat d'execució real per al conjunt de l'Ajuntament és del 46,34%, quan segons la previsió planificada hauria d'arribar al 57,74%. La desviació és lleugerament superior al 10%, situació que es considera assumible i que es creu que serà possible compensar, almenys parcialment, durant l'any 2026.

Propostes




Tenint en compte allò indicat a la part expositiva, es considera adient i s'informa favorablement que des de l'Alcaldia es proposi a la Junta de govern local l'aprovació de l'avaluació de l'estat d'execució del Pla d'acció municipal 2023-2027 a data 31 de desembre de 2025, d'acord amb el que es recull en aquest informe, incloses les modificacions, i en el document annex que forma part de l'expedient.

Estat d'execució per regidories a 31/12/2025

Conjunt de l'Ajuntament

Accions	Nombre	%
Planificades:	205	
Cancel·lades:	6	2,93%
Programades i no cancel·lades	172	83,90%
Iniciades:	154	89,53%
Programades i no iniciades a 31/12/2025	18	10,47%
Avançades a l'inici programat	8	3,90%
Completades a 31/12/2025	29	16,86%

Estat d'execució a 31/12/2025




Previst	Real	Situació
<p>57,74%</p> 	<p>46,34%</p> 	

Estat d'execució per regidories a 31/12/2025

1000 Alcaldia

Accions	Nombre	%
Planificades:	21	
Cancel·lades:	1	4,76%
Programades i no cancel·lades	15	71,43%
Iniciades:	14	93,33%
Programades i no iniciades a 31/12/2025	1	6,67%
Avançades a l'inici programat	1	4,76%
Completades a 31/12/2025	2	13,33%

Estat d'execució a 31/12/2025


Previst	Real	Situació
<p>50,43%</p> 	<p>44,05%</p> 	

1000 Alcaldia

33210 Biblioteca municipal 'Joan Coromines'



Accions	Nombre	%
Planificades:	2	
Cancel·lades:	0	4,76%
Programades i no cancel·lades	2	71,43%
Iniciades:	2	93,33%
Programades i no iniciades a 31/12/2025	0	6,67%
Avançades a l'inici programat	0	4,76%
Completades a 31/12/2025	0	13,33%

Estat d'execució a 31/12/2025

Previst	Real	Situació
61,00%	61,00%	

ODS vinculats:



Núm	Acció	Comentari	Prev. actualitzada		Execució		Estat d'execució			
			Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
039	Potenciar, d'acord amb les possibilitats de la Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona, instruments de suport a la lectura amb persones amb dificultats cognitives, auditives o visuals.	Durant 2025 s'ha comprovat que el fons adquirit compleix les demandes de la població, però la biblioteca, en ple procés de desenvolupament del Pla Local de Foment de la Lectura, té previstes més accions al respecte i aquesta percepció pot variar.	09/2023	06/2027	09/2023		61%	61%		<input type="checkbox"/>
111	Impulsar iniciatives per al foment de la lectura en català des de la Biblioteca, en el marc del Pla Nacional de la Lectura.	Durant 2025 l'acció s'ha desenvolupat d'acord amb allò previst, en el marc del desenvolupament del Pla Local de Foment de la Lectura.	09/2023	06/2027	09/2023		61%	61%		<input type="checkbox"/>

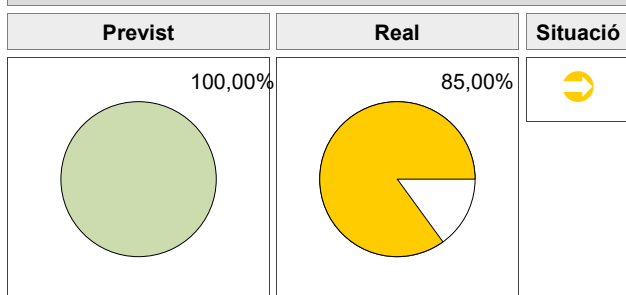


1000 Alcaldia

33220 Arxiu municipal

Accions	Nombre	%
Planificades:	1	
Cancel·lades:	0	4,76%
Programades i no cancel·lades	1	71,43%
Iniciades:	1	93,33%
Programades i no iniciades a 31/12/2025	0	6,67%
Avançades a l'inici programat	0	4,76%
Completades a 31/12/2025	0	13,33%

Estat d'execució a 31/12/2025



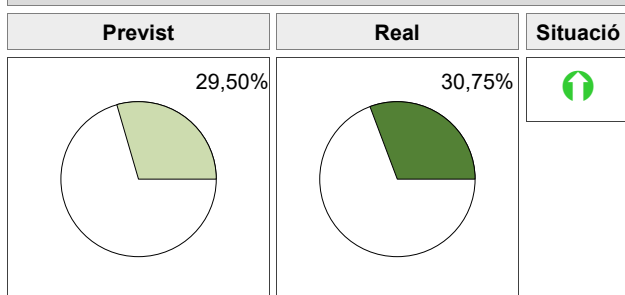
ODS vinculats:







Núm	Acció	Comentari	Prev. actualitzada		Execució		Estat d'execució			
			Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
115	Millorar les instal·lacions de l'Arxiu municipal (WiFi, il·luminació...).	En 2025 ha quedat pendent la compra de làmpades, que es preveu executar en 2026.	01/2024	12/2025	01/2024		100%	85%		<input type="checkbox"/>

Estat d'execució per regidories a 31/12/2025
1000 Alcaldia
33300 Equipaments culturals.

Accions	Nombre	%
Planificades:	4	
Cancel·lades:	0	4,76%
Programades i no cancel·lades	2	71,43%
Iniciades:	2	93,33%
Programades i no iniciades a 31/12/2025	0	6,67%
Avançades a l'inici programat	1	4,76%
Completades a 31/12/2025	0	13,33%

Estat d'execució a 31/12/2025

ODS vinculats:



Núm	Acció	Comentari	Prev. actualitzada		Execució		Estat d'execució				Canc.
			Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació		
108	Culminar el projecte de recuperació global de l'espai de «La Fabriqueta».	S'ha aprovat el projecte executiu i s'ha publicat la licitació de la fase 1 de l'obra.	01/2024	06/2027	01/2024		57%	57%		<input type="checkbox"/>	
112	Continuar la negociació per a la rehabilitació del Teatre del Casino.	L'inici de l'acció és previst per l'any 2026.	01/2026	06/2027			0%	0%		<input type="checkbox"/>	
113	Fer un mapa de l'estat i de les necessitats en relació amb la creació, la programació i la difusió cultural al municipi.	L'inici de l'acció és previst per gener de 2026. Amb tot, durant 2025 s'han realitzat algunes actuacions prèvies: - El març de 2025 s'ha posat en marxa un nou canal de difusió de WhatsApp d'activitats culturals del municipi. - El juliol de 2025, s'ha elaborat un cens d'artistes vinculats amb el municipi en actiu per convidar-los a l'exposició col·lectiva "Visions artístiques. Dos-cents anys de la vila". S'ha produït l'exposició per difondre l'obra de 64 artistes. - S'han dut a terme diverses trobades per crear espais d'intercanvi.	01/2026	12/2026			0%	5%		<input type="checkbox"/>	
125	Fer sengles projectes d'impuls i visibilitat de l'Espai d'art cinètic «Jordi Pericot» i de l'Espai escènic «Iago Pericot».	Durant l'any 2025 han continuat les residències a la Sala B de l'Espai Escènic Iago Pericot i al novembre de 2026 es farà una nova edició de la Biennal.	09/2023	06/2027	09/2023		61%	61%		<input type="checkbox"/>	

1000 Alcaldia

33411 Festivals artístics i culturals.


Accions	Nombre	%
Planificades:	1	
Cancel·lades:	0	4,76%
Programades i no cancel·lades	1	71,43%
Iniciades:	1	93,33%
Programades i no iniciades a 31/12/2025	0	6,67%
Avançades a l'inici programat	0	4,76%
Completades a 31/12/2025	0	13,33%

Estat d'execució a 31/12/2025

Previst	Real	Situació
57,00%	57,00%	

ODS vinculats:




Núm	Acció	Comentari	Prev. actualitzada		Execució		Estat d'execució			
			Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
114	Crear una programació cultural fora dels espais tancats, en espais a l'aire lliure com són el parc Vallmora i altres zones verdes o els carrers per a vianants.	Durant l'any 2025 el projecte ha tingut continuïtat i s'ha executat amb normalitat i dins el previst.	01/2024	06/2027	01/2024		57%	57%		<input type="checkbox"/>

1000 Alcaldia

33412 Arts escèniques.


Accions	Nombre	%
Planificades:	1	
Cancel·lades:	0	4,76%
Programades i no cancel·lades	1	71,43%
Iniciades:	1	93,33%
Programades i no iniciades a 31/12/2025	0	6,67%
Avançades a l'inici programat	0	4,76%
Completades a 31/12/2025	0	13,33%

Estat d'execució a 31/12/2025

Previst	Real	Situació
57,00%	57,00%	

ODS vinculats:




Núm	Acció	Comentari	Prev. actualitzada		Execució		Estat d'execució			
			Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
124	Potenciar les residències artístiques a través de la sala B de Ca n'Humet, dedicant aquesta sala a l'Espai Jove quan no se n'ocupa.	Durant l'any 2025 han conitnuat les residències per a companyies i professionals de les arts escèniques. Es preveu fer una nova edició de la Biennial Iago Pericot al novembre de 2026.	01/2024	06/2027	01/2024		57%	57%		<input type="checkbox"/>






1000 Alcaldia
33611 Protecció i gestió del patrimoni històric i artístic. Museu municipal.

Accions	Nombre	%
Planificades:	5	
Cancel·lades:	0	4,76%
Programades i no cancel·lades	3	71,43%
Iniciades:	3	93,33%
Programades i no iniciades a 31/12/2025	0	6,67%
Avançades a l'inici programat	0	4,76%
Completades a 31/12/2025	0	13,33%

Estat d'execució a 31/12/2025

Previst	Real	Situació
34,20%	34,20%	

ODS vinculats:

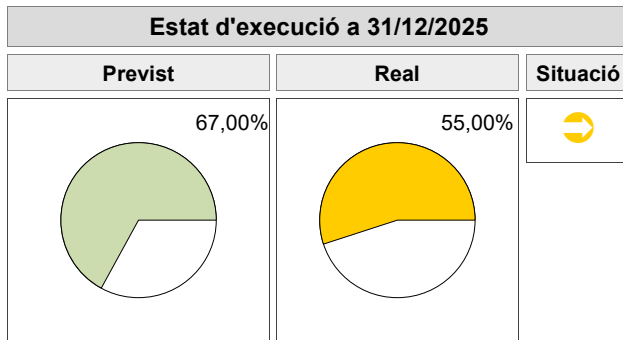

Núm	Acció	Comentari	Prev. actualitzada		Execució		Estat d'execució			
			Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
116	Dur a terme reconeixements a persones i entitats que promoguin la memòria històrica i la identitat del municipi.	L'acció s'executa segons allò previst.	01/2024	06/2027	01/2024		57%	57%		<input type="checkbox"/>
117	Elaborar un cens de víctimes i victimaris de la guerra d'Espanya i de la dictadura franquista.	L'acció s'iniciarà en 2026.	01/2026	06/2027			0%	0%		<input type="checkbox"/>
118	Treballar per establir el Centre d'Estudis Històrics Locals a l'Arxiu Municipal.	Es preveu que l'acció s'iniciarà en 2026.	01/2026	06/2027			0%	0%		<input type="checkbox"/>
119	Impulsar espais de recuperació de la memòria històrica, en especial del paper de les dones.	Durant l'any 2025 s'han realitzat les actuacions següents: - Valoració del mobiliari a conservar de La Fabriqueta, per tal de crear un racó museogràfic en el futur equipament. - Elaboració dels textos per a l'exposició "El Masnou. 200 anys d'història" en el marc del Bicentenari. - Visites d'escoles a l'Arxiu, en algunes de les quals s'ha treballat la recerca d'espais de memòria o la importància de les dones en la història local. - Exposició temporal "Dones destacades del Masnou", produïda per l'Arxiu i el Museu, a l'Escola Bergantí. A més, s'ha ofert assessorament històric i documentació del mapeig del Bicentenari i s'han produït els roll-up de l'exposició "El Masnou, 200 anys d'història" per tal d'oferir-lo a les escoles durant el proper curs escolar: 2025-2026.	09/2024	12/2026	09/2024		57%	57%		<input type="checkbox"/>
128	Potenciar els itineraris guiats vinculats al coneixement del patrimoni arquitectònic, històric, cultural i ambiental del Masnou.	L'acció s'ha desenvolupat d'acord amb allò previst. S'ha fet l'activitat nova "Visita guiada a la mina Cresta a càrrec d'una tècnica en espeleologia" en el marc de la V Jornada de Portes Obertes a Safareigs del Masnou (12 d'octubre). S'han rebut un total de 166 respostes de l'enquesta de satisfacció per part de les persones usuàries d'aquestes activitats amb un resultat molt positiu, ja que el 95,78% de les persones que han respost l'enquesta recomanen l'activitat i la valoració global ha estat d'un 4,70 sobre 5.	01/2024	06/2027	01/2024		57%	57%		<input type="checkbox"/>



1000 Alcaldia

91200 Òrgans de govern.

Accions	Nombre	%
Planificades:	1	
Cancel·lades:	0	4,76%
Programades i no cancel·lades	1	71,43%
Iniciades:	1	93,33%
Programades i no iniciades a 31/12/2025	0	6,67%
Avançades a l'inici programat	0	4,76%
Completades a 31/12/2025	0	13,33%






ODS vinculats:

Núm	Acció	Comentari	Prev. actualitzada		Execució		Estat d'execució			
			Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
156	Elaborar un pla estratègic per a la consecució de l'agenda urbana 2030.	Les actuacions en relació amb aquesta acció s'han centrat en el projecte d'elaboració del nou Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS), en el qual es concretaran estratègies pròpies de l'agenda urbana 2030. A la data d'avaluació s'han dut a terme els treballs preliminars i s'ha iniciat el procés de participació ciutadana. Es preveu les tasques d'elaboració del PMUS que ha de dur a terme l'Ajuntament hauran acabat a finals de 2026..	01/2024	12/2026	01/2024		67%	55%		<input type="checkbox"/>


Estat d'execució per regidories a 31/12/2025
1000 Alcaldia
92200 Coordinació general.

Accions	Nombre	%
Planificades:	1	
Cancel·lades:	0	4,76%
Programades i no cancel·lades	1	71,43%
Iniciades:	1	93,33%
Programades i no iniciades a 31/12/2025	0	6,67%
Avançades a l'inici programat	0	4,76%
Completades a 31/12/2025	1	13,33%

Estat d'execució a 31/12/2025

Previst	Real	Situació
100,00%	100,00%	
		

ODS vinculats:

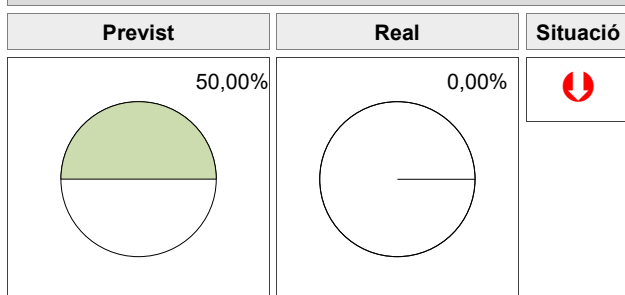

Núm	Acció	Comentari	Prev. actualitzada		Execució		Estat d'execució			
			Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
101	Estudiar l'impacte que tindria al Masnou la inclusió del municipi a l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).	En data 19 de maig de 2025 es va signar un "Informe preliminar relatiu a l'impacte econòmic que suposaria per al municipi l'ingrés del Masnou a l'Àrea Metropolitana de Barcelona i al procés a seguir per aquesta incorporació", elaborat pel Gerent municipal, el qual ha estat lliurat a l'Alcaldia. L'acció es considera completada.	01/2025	12/2025	01/2025	06/2025	100%	100%		<input type="checkbox"/>

1000 Alcaldia

92410 Participació ciutadana.



Accions	Nombre	%
Planificades:	2	
Cancel·lades:	1	4,76%
Programades i no cancel·lades	1	71,43%
Iniciades:	0	93,33%
Programades i no iniciades a 31/12/2025	1	6,67%
Avançades a l'inici programat	0	4,76%
Completades a 31/12/2025	0	13,33%

Estat d'execució a 31/12/2025



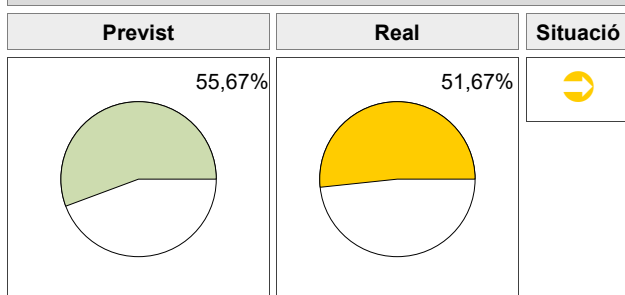
ODS vinculats:






Núm	Acció	Comentari	Prev. actualitzada		Execució		Estat d'execució			Canc.
			Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	
157	Implantar la figura del regidor o regidora i dels consells de barri.	L'àmbit gestor proposa la cancel·lació de l'acció, ateses les dificultats per la seva execució en el tram final del mandat.	09/2025	06/2027			0%	0%		<input checked="" type="checkbox"/>
158	Realitzar un procés participatiu entre tota la ciutadania per tal de definir els usos i els elements de l'actual pati del Casino perquè esdevingui la plaça de la Vila.	L'acció no s'ha pogut dur a terme durant el 2025, degut a les dificultats generades pel litigi existent. No obstant, s'estan duent a terme converses amb l'entitat.	01/2025	12/2025			100%	0%		<input type="checkbox"/>

Estat d'execució per regidories a 31/12/2025
1000 Alcaldia
92510 Comunicació i informació general a la ciutadania.

Accions	Nombre	%
Planificades:	3	
Cancel·lades:	0	4,76%
Programades i no cancel·lades	2	71,43%
Iniciades:	2	93,33%
Programades i no iniciades a 31/12/2025	0	6,67%
Avançades a l'inici programat	0	4,76%
Completades a 31/12/2025	1	13,33%

Estat d'execució a 31/12/2025

ODS vinculats:





Núm	Acció	Comentari	Prev. actualitzada		Execució		Estat d'execució				Canc.
			Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació		
159	Millorar la visualització de l'agenda pública de l'equip de govern.	L'acció es va completar d'acord amb les previsions.	09/2023	12/2023	09/2023	12/2023	100%	100%		<input type="checkbox"/>	
199	Modernitzar el lloc web de l'Ajuntament.	Durant l'any 2025 diversos departaments han estat treballant en l'elaboració dels plecs tècnics i de l'informe de necessitats per tal de dur a terme la contractació de la confecció d'un nou web municipal.	01/2024	12/2026	11/2024		67%	55%		<input type="checkbox"/>	
200	Elaborar un estudi per a la creació d'un mitjà de comunicació digital.	L'inici de l'acció és planificat per gener de 2026.	01/2026	12/2026			0%	0%		<input type="checkbox"/>	

Estat d'execució per regidories a 31/12/2025

2032 Modernització i atenció ciutadana

Accions	Nombre	%
Planificades:	5	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	5	100,00%
Iniciades:	5	100,00%
Programades i no iniciades a 31/12/2025	0	0,00%
Avançades a l'inici programat	0	0,00%
Completades a 31/12/2025	0	0,00%

Estat d'execució a 31/12/2025


Previst	Real	Situació
<p>67,40%</p> 	<p>65,40%</p> 	

2032 Modernització i atenció ciutadana

49100 Societat del coneixement


Accions	Nombre	%
Planificades:	1	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	1	100,00%
Iniciades:	1	100,00%
Programades i no iniciades a 31/12/2025	0	0,00%
Avançades a l'inici programat	0	0,00%
Completades a 31/12/2025	0	0,00%

Estat d'execució a 31/12/2025

Previst	Real	Situació
50,00%	50,00%	

ODS vinculats:



Núm	Acció	Comentari	Prev. actualitzada		Execució		Estat d'execució			
			Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
204	Estendre les zones WiFi en espais públics.	S'ha posat en marxa un sistema d'accés a internet per WiFi a l'Edifici Centre, que està funcionant correctament. Així mateix, la Biblioteca compta amb un accés WiFi propi per les persones usuàries. En altres equipaments hi ha disponibles accessos WiFi circumstancials en funció de les activitats que s'hi realitzen.	01/2025	12/2026	01/2025		50%	50%		<input type="checkbox"/>



2032 Modernització i atenció ciutadana

49200 Governança de dades

Accions	Nombre	%
Planificades:	1	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	1	100,00%
Iniciades:	1	100,00%
Programades i no iniciades a 31/12/2025	0	0,00%
Avançades a l'inici programat	0	0,00%
Completades a 31/12/2025	0	0,00%

Estat d'execució a 31/12/2025

Previst	Real	Situació
80,00%	80,00%	

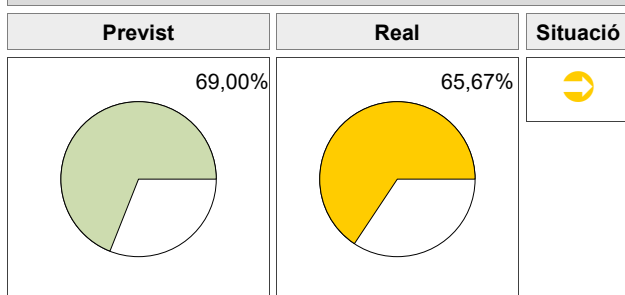
ODS vinculats:






Núm	Acció	Comentari	Prev. actualitzada		Execució		Estat d'execució			
			Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
197	Crear una oficina central de dades que reculli tota la informació possible per a la millora dels serveis i per crear nous projectes amb visió estratègica.	Durant l'any 2025 s'ha posat en funcionament l'Oficina de Governança de Dades de l'Ajuntament. A 31 de desembre de 2025 el projecte es troba en la fase d'implantació. S'ha completat el catàleg de dades de l'Ajuntament, s'ha treballat amb una consultora externa l'anàlisi de les infraestructures físiques i lògiques necessàries i s'han previst les despeses corrents i les inversions necessàries al pressupost per l'any 2026. Igualment, s'han realitzat diverses proves inicials amb anàlisi i explotació de dades municipals i s'ha reactivat la utilització del sistema d'informació geogràfica (SIG) vinculat a dades. Es preveu que l'acció es completarà dins dels terminis previstos.	01/2024	06/2026	01/2024		80%	80%		<input type="checkbox"/>

2032 Modernització i atenció ciutadana
92500 Atenció general a la ciutadania.

Accions	Nombre	%
Planificades:	3	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	3	100,00%
Iniciades:	3	100,00%
Programades i no iniciades a 31/12/2025	0	0,00%
Avançades a l'inici programat	0	0,00%
Completades a 31/12/2025	0	0,00%

Estat d'execució a 31/12/2025

ODS vinculats:




Núm	Acció	Comentari	Prev. actualitzada		Execució		Estat d'execució			
			Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
201	Augmentar i millorar els tràmits telemàtics (telèfon, en línia i video tràmit), tot i reforçant l'atenció presencial i personal	El servei de videotràmit no s'ha previst inicialment en el pressupost 2026. El projecte OAC 360 serà objecte de valoració durant l'any 2026. L'AppTràmit es troba en fase proves per activar-la durant el primer trimestre del 2026.	01/2024	06/2027	01/2024		57%	57%		<input type="checkbox"/>
202	Crear una nova Oficina d'Atenció Ciutadana a la plaça Nova de les Dones del Tèxtil.	Durant l'any 2025 s'ha treballat conjuntament amb l'ORGT sobre les necessitats i adaptacions dels espais destinats a l'atenció al públic i complementaris, una vegada acabades les obres de l'estructura. La contractació del projecte i de les obres de distribució i adequació dels espais es farà a inicis de l'any 2026.	01/2025	12/2026	09/2024		50%	50%		<input type="checkbox"/>
205	Revisar el protocol d'acollida al municipi amb tots els serveis de l'Ajuntament i les entitats vinculades.	Durant l'any 2025 s'ha treballat el protocol amb l'Alcaldia i està pendent de revisió amb Gerència, per la seva posta en funcionament.	01/2024	06/2025	01/2024		100%	90%		<input type="checkbox"/>

Estat d'execució per regidories a 31/12/2025

2040 Seguretat ciutadana

Accions	Nombre	%
Planificades:	6	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	5	83,33%
Iniciades:	5	100,00%
Programades i no iniciades a 31/12/2025	0	0,00%
Avançades a l'inici programat	0	0,00%
Completades a 31/12/2025	1	20,00%

Estat d'execució a 31/12/2025

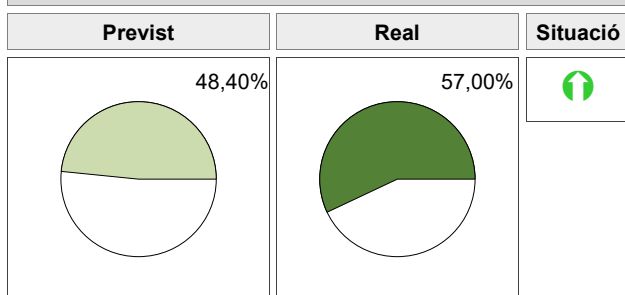
Previst	Real	Situació
<p>48,50%</p> 	<p>55,67%</p> 	<p>↑</p>

2040 Seguretat ciutadana

13200 Policia local






Accions	Nombre	%
Planificades:	5	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	4	83,33%
Iniciades:	4	100,00%
Programades i no iniciades a 31/12/2025	0	0,00%
Avançades a l'inici programat	0	0,00%
Completades a 31/12/2025	1	20,00%

Estat d'execució a 31/12/2025



ODS vinculats:




Núm	Acció	Comentari	Prev. actualitzada		Execució		Estat d'execució				Canc.
			Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació		
040	Incrementar la presència de dones en el cos de la Policia Local.	Aquesta acció queda condicionada al nombre de places que es puguin convocar a l'oposició d'acord amb l'oferta pública. El percentatge de places reservades al sexe femení està relacionat amb el total de places que finalment es puguin ofertar (un mínim de 4).	01/2024	06/2027	01/2024		57%	57%		<input type="checkbox"/>	
169	Impulsar la mediació com a mitjà per a la resolució de conflictes veïnals.	Amb el canvi de prefectura s'ha creat la Unitat de Proximitat Estratègica, dirigida per un sergent, que s'encarregarà de les mediacions i d'enfortir els llaços de comunicació amb la comunitat. Ja s'han començat a establir contactes amb entitats, associacions i altres col·lectius per donar a conèixer la unitat.	09/2023	06/2027	09/2023		61%	61%		<input type="checkbox"/>	
170	Millorar el parc de vehicles de dues rodes de la policia municipal.	L'acció s'ha completat en 2024.	01/2024	06/2027	01/2024	12/2024	57%	100%		<input type="checkbox"/>	
171	Estudiar la viabilitat de la instal·lació de càmeres a l'entrada i sortida del municipi perquè puguin detectar possibles amenaces per la població.	A la data de realització de l'avaluació es disposa de tres càmeres de videovigilància noves instal·lades, ja s'han demanat els permisos corresponents a la DGAS. Cada punt incorpora una càmera d'ambient i una càmera de lectura de matrícules. Durant l'any 2026 es preveu ampliar-ne el nombre.	01/2026	12/2026	01/2026		0%	0%		<input type="checkbox"/>	
172	Estudiar i implantar progressivament tecnologies de la informació i la comunicació a l'àmbit de la seguretat ciutadana.	El programa informàtic de gestió policial ja es troba en funcionament. Amb l'objectiu de millorar la comunicació i les gestions diàries de les patrulles operatives, s'han adquirit sis tauletes portàtils que permeten optimitzar les prestacions que ofereix el nou programari. En aquesta mateixa línia, també s'ha adquirit un programa informàtic específic per a l'elaboració de croquis d'accidents de circulació. Així mateix, s'han incorporat sis càmeres personals amb la finalitat d'incrementar la seguretat tant dels agents com de la ciutadania durant les intervencions, fet que contribueix a modernitzar i adequar la policia local als estàndards d'una policia moderna.	01/2024	12/2026	01/2024		67%	67%		<input type="checkbox"/>	


2040 Seguretat ciutadana
13400 Mobilitat urbana

Accions	Nombre	%
Planificades:	1	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	1	83,33%
Iniciades:	1	100,00%
Programades i no iniciades a 31/12/2025	0	0,00%
Avançades a l'inici programat	0	0,00%
Completades a 31/12/2025	0	20,00%

Estat d'execució a 31/12/2025

Previst	Real	Situació
49,00%	49,00%	




ODS vinculats:


Núm	Acció	Comentari	Prev. actualitzada		Execució		Estat d'execució			Canc.
			Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	
093	Vetllar per un correcte ús dels vials per part de vianants, bicicletes i altres vehicles de mobilitat personal (VMP).	La tramitació de la modificació de l'Ordenança de Circulació es troba en la seva recta final. Aquesta Ordenança és la norma que regula l'ús dels vials per bicicletes i VMP, sens perjudici de la normativa estatal que també els és aplicable. Pel que fa al control periòdic, la Policia Local duu a terme campanyes en col·laboració amb el Servei Català de Trànsit (SCT) i, de manera ordinària, el control d'aquests vehicles és un dels objectius dels agents.	09/2024	05/2027	09/2024		49%	49%		<input type="checkbox"/>

Estat d'execució per regidories a 31/12/2025
2051 Promoció econòmica i turisme

Accions	Nombre	%
Planificades:	9	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	9	100,00%
Iniciades:	9	100,00%
Programades i no iniciades a 31/12/2025	0	0,00%
Avançades a l'inici programat	0	0,00%
Completades a 31/12/2025	1	11,11%




Estat d'execució a 31/12/2025

Previst	Real	Situació
54,78% 	56,33% 	


43120 Mercats

Accions	Nombre	%
Planificades:	1	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	1	100,00%
Iniciades:	1	100,00%
Programades i no iniciades a 31/12/2025	0	0,00%
Avançades a l'inici programat	0	0,00%
Completades a 31/12/2025	1	11,11%

Estat d'execució a 31/12/2025

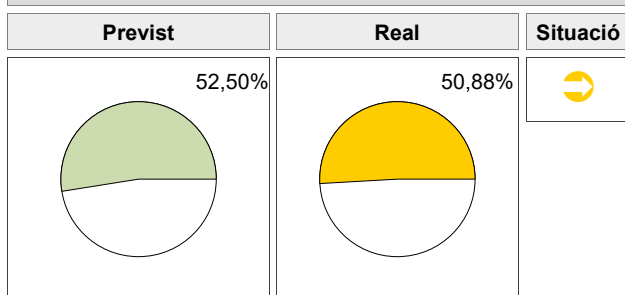
Previst	Real	Situació
73,00% 	100,00% 	








ODS vinculats:


Núm	Acció	Comentari	Prev. actualitzada		Execució		Estat d'execució			
			Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
154	Impulsar la creació d'un espai gastronòmic dins del Mercat Municipal.	L'any 2025 es va portar a terme la posta en marxa i dinamització del punt, amb la qual cosa l'acció es considera completada. Amb tot, el projecte s'acabarà de consolidar durant el 2026, quan es preveu donar continuïtat a activitats de dinamització de l'espai inaugurat al gener de 2025.	01/2024	09/2026	01/2024	06/2025	73%	100%		<input type="checkbox"/>


2051 Promoció econòmica i turisme
43300 Desenvolupament empresarial

Accions	Nombre	%
Planificades:	8	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	8	100,00%
Iniciades:	8	100,00%
Programades i no iniciades a 31/12/2025	0	0,00%
Avançades a l'inici programat	0	0,00%
Completades a 31/12/2025	0	11,11%

Estat d'execució a 31/12/2025

ODS vinculats:


Núm	Acció	Comentari	Prev. actualitzada		Execució		Estat d'execució				Canc.
			Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació		
144	Crear un HUB tecnològic per atreure activitat econòmica i crear ocupació de qualitat.	La Diputació de Barcelona ha concedit una subvenció per a la realització d'un estudi sobre aquest projecte, per import de 8.538,00 € (anualitats 2025 i 2026), amb un cofinançament municipal del 40%. En data 19 de desembre de 2025 es va contractar a la Cambra de Comerç de Barcelona la realització de l'estudi.	01/2025	06/2027	01/2025		40%	40%		<input type="checkbox"/>	
147	Impulsar una Oficina d'Atenció a l'Empresa com a concreció de la finestra única empresarial (FUE).	Com a actuació prèvia, s'ha començat a treballar des de la Gerència municipal en la implantació d'una base de dades única o cens de les activitats econòmiques del municipi.	09/2025	06/2027	09/2025		18%	5%		<input type="checkbox"/>	
148	Incloure dins les jornades d'emprenedoria formacions adreçades específicament a fomentar el cooperativisme i la creació d'empreses d'economia social.	Durant el segon semestre de 2025 s'han iniciat contactes per l'adhesió de l'Ajuntament a la Xarxa de Municipis per l'Economia Social i Solidària.	01/2024	06/2027	01/2024		57%	57%		<input type="checkbox"/>	
149	Renovar la il·luminació de Nadal, especialment la dels trams de carrers que formin part d'eixos comercials.	Durant l'any 2025 s'ha fet una inversió de 14.665,30 € amb aquesta finalitat.	01/2024	12/2027	01/2024		50%	50%		<input type="checkbox"/>	
150	Dinamitzar els eixos comercials de la Vila, amb especial atenció als existents fora del centre.	Durant l'any 2025 s'ha iniciat el desplegament de la campanya de dinamització comercial "Masnou Connecta", que té per objectiu la dinamització del comerç i els eixos comercials, i posicionar el comerç com a peça clau com a vehiculador social.	01/2024	12/2026	01/2024		67%	67%		<input type="checkbox"/>	
151	Potenciar les trobades «Cafè i empresa» com a programa on empreses del municipi poden fer xarxa i crear sinergies.	A 31 de desembre de 2025 s'han realitzat quatre sessions, els mesos de març, maig, setembre i desembre.	09/2023	12/2026	09/2023		70%	70%		<input type="checkbox"/>	
152	Reforçar l'oferta d'activitats realitzada en col·laboració amb la DO Alella i el Consorci Enoturístic.	L'acció es desenvolupa d'acord amb les previsions. S'han portat a terme els cinc "Tasta el Masnou" de l'any, amb una venda del 96% de les entrades de les primeres quatre edicions i d'un 48% de l'última (producte dolç). Per al 2026 s'han programat cinc edicions en el Punt Gastronòmic del Mercat del Masnou per tal de contribuir a la seva dinamització.	01/2024	06/2027	01/2024		57%	57%		<input type="checkbox"/>	




2051 Promoció econòmica i turisme

Núm	Acció	Comentari	Prev. actualitzada		Execució		Estat d'execució			
			Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
155	Fer xerrades als instituts del municipi sobre emprenedoria, empresa i cooperativisme, coneixement del món laboral i orientació professional	L'acció es desenvolupa d'acord amb les previsions. Durant el primer semestre del 2025 s'han dut a terme tallers als instituts Maremar i Mediterrània, a l'institut escola Lluís Millet i a l'escola Bergantí. La proposta ha consistit en 8 tallers relacionats amb el món de l'emprenedoria, que han estat triats per les persones participants segons les seves necessitats i s'han adequat als seus calendaris. Dins de les activitats, s'han fet visites a la fàbrica del vidre, activitat que ha tingut una gran acollida. Durant el segon semestre de l'any, s'han fet tres formacions, dues sessions de dones emprenedores i dues visites a la Casa del Marquès. El mes de novembre es va realitzar la sessió inaugural del programa amb xerrades i una taula rodona.	09/2023	06/2027	09/2023		61%	61%		<input type="checkbox"/>

Estat d'execució per regidories a 31/12/2025
3011 Acció cívica i festes

Accions	Nombre	%
Planificades:	1	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	1	100,00%
Iniciades:	1	100,00%
Programades i no iniciades a 31/12/2025	0	0,00%
Avançades a l'inici programat	0	0,00%
Completades a 31/12/2025	1	100,00%




Estat d'execució a 31/12/2025

Previst	Real	Situació
100,00% 	100,00% 	


32700 Foment del civisme i equipaments cívics municipals.

Accions	Nombre	%
Planificades:	1	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	1	100,00%
Iniciades:	1	100,00%
Programades i no iniciades a 31/12/2025	0	0,00%
Avançades a l'inici programat	0	0,00%
Completades a 31/12/2025	1	100,00%

Estat d'execució a 31/12/2025

Previst	Real	Situació
100,00% 	100,00% 	

ODS vinculats:




Núm	Acció	Comentari	Prev. actualitzada		Execució		Estat d'execució			
			Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
194	Finalitzar el condicionament de l'equipament cívic del carrer del Paraguai i impulsar-ne la dinamització cultural, lúdica i social a través de l'activitat veïnal del Cul d'Ocata.	L'acció s'ha completat en el termini previst. Durant l'any 2025 l'associació veïnal Cul d'Ocata ha seguit dinamitzant l'espai del carrer Paraguai. Es preveu fer una renovació de cessió d'espai durant el 2026.	09/2023	11/2023	09/2023	12/2024	100%	100%		<input type="checkbox"/>

Estat d'execució per regidories a 31/12/2025

3021 Acció social

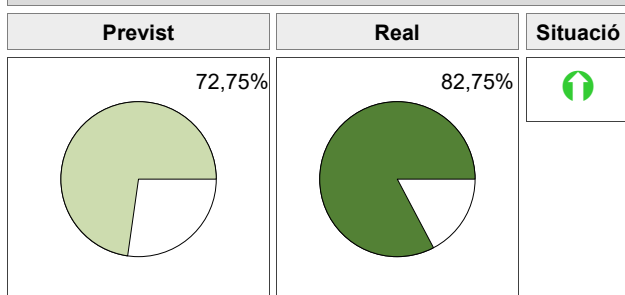
Accions	Nombre	%
Planificades:	7	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	5	71,43%
Iniciades:	5	100,00%
Programades i no iniciades a 31/12/2025	0	0,00%
Avançades a l'inici programat	1	14,29%
Completades a 31/12/2025	2	40,00%





Estat d'execució a 31/12/2025

Previst	Real	Situació
<p>50,29%</p> 	<p>66,71%</p> 	<p>↑</p>

3021 Acció social
23111 Servei bàsic d'atenció social (SBAS).

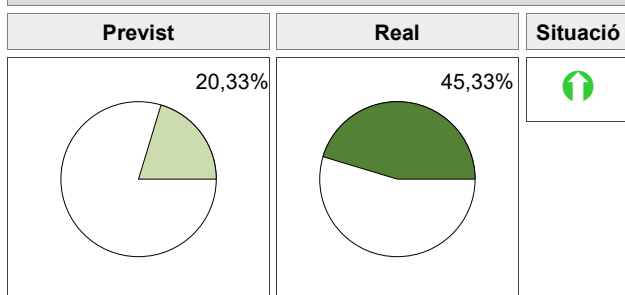
Accions	Nombre	%
Planificades:	4	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	4	71,43%
Iniciades:	4	100,00%
Programades i no iniciades a 31/12/2025	0	0,00%
Avançades a l'inici programat	0	14,29%
Completades a 31/12/2025	2	40,00%




Estat d'execució a 31/12/2025

ODS vinculats:


Núm	Acció	Comentari	Prev. actualitzada		Execució		Estat d'execució				Canc.
			Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació		
042	Reforçar l'estructura de personal dels serveis socials bàsics tenint en compte les necessitats de la població.	Durant 2025 s'ha procedit a la contractació d'una Treballadora social amb l'objectiu d'equilibrar la ràtio de professionals de l'equip bàsic de serveis socials. Es considera que l'acció ha estat finalitzada, ja que a a 31 de desembre l'equip bàsic és complet.	01/2025	06/2027	01/2025	12/2025	40%	100%		<input type="checkbox"/>	
043	Redefinir el projecte del Centre de distribució d'aliments (CDA) «La Sitja».	Durant l'any 2025 s'ha procedit a canviar el model de funcionament del CDA, amb l'augment de l'ús de targetes moneder vinculades a persones usuàries dels serveis socials municipals.	01/2025	12/2025	01/2025		100%	80%		<input type="checkbox"/>	
045	Mantenir i reforçar, quan sigui necessari, els recursos per pernoctacions d'urgència de persones vulnerables, d'acord amb el protocol d'acollida bàsic.	Durant 2025 s'ha tramitat un contracte menor per afrontar la situació d'emergència habitacional, amb l'objectiu de reforçar els recursos destinats a la pernoctació. Quant els pisos de propietat municipal, ja s'han posat a disposició com a recurs habitacional. Es considera que el desenvolupament de l'acció es troba al dia.	06/2024	06/2027	06/2024		51%	51%		<input type="checkbox"/>	
047	Millorar el funcionament del Consell de Benestar Social per tal d'afavorir l'intercanvi i la participació de les entitats en les polítiques socials de l'Ajuntament.	L'acció es va completar en el termini previst. Durant 2025 s'estan desenvolupant les taules de treball amb objectius clars i concrets, amb la participació activa del tercer sector. Es realitzen, com a mínim, tres o quatre trobades anuals per àmbit, i posteriorment es presenten els resultats al Consell de Benestar Social.	09/2023	12/2023	09/2023	12/2023	100%	100%		<input type="checkbox"/>	

3021 Acció social
23112 Serveis d'atenció a la dependència i promoció de l'autonomia personal

Accions	Nombre	%
Planificades:	3	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	1	71,43%
Iniciades:	1	100,00%
Programades i no iniciades a 31/12/2025	0	0,00%
Avançades a l'inici programat	1	14,29%
Completades a 31/12/2025	0	40,00%

Estat d'execució a 31/12/2025

ODS vinculats:




Núm	Acció	Comentari	Prev. actualitzada		Execució		Estat d'execució			
			Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
015	Augmentar les hores del servei d'ajuda a domicili (SAD), posant en valor l'activitat de cures i tenint en compte les necessitats de formació i mobilitat de les persones ocupades en aquest sector.	L'acció s'ha executat durant 2025 segons les previsions, tenint en compte l'adequació dels imports del Servei d'Atenció Domiciliària i les necessitats pròpies del servei.	09/2023	06/2027	09/2023		61%	61%		<input type="checkbox"/>
027	Estudiar la viabilitat d'un Centre de dia públic i municipal.	Durant 2025, des de la Gerència municipal s'ha elaborat un estudi preliminar que s'ha lliurat al servei gestor. Restava pendent de revisió i validació final.	01/2026	12/2026	06/2025		0%	75%		<input type="checkbox"/>
044	Impulsar una llar residència vinculada a l'equipament de Can Targa.	Acció prevista per l'any 2026.	01/2026	12/2026			0%	0%		<input type="checkbox"/>

Estat d'execució per regidories a 31/12/2025

3040 Educació

Accions	Nombre	%
Planificades:	9	
Cancel·lades:	1	11,11%
Programades i no cancel·lades	8	88,89%
Iniciades:	8	100,00%
Programades i no iniciades a 31/12/2025	0	0,00%
Avançades a l'inici programat	0	0,00%
Completades a 31/12/2025	2	25,00%

Estat d'execució a 31/12/2025

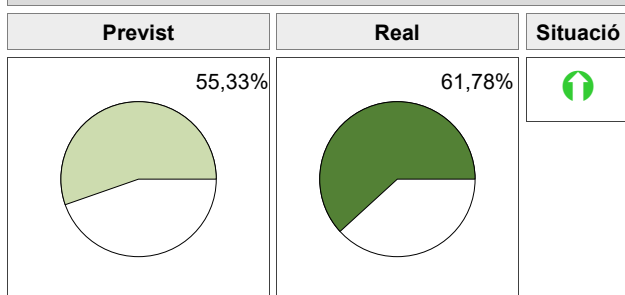
Previst	Real	Situació
<p>55,33%</p> 	<p>61,78%</p> 	<p>↑</p>

3040 Educació

32611 Promoció educativa.







Accions	Nombre	%
Planificades:	9	
Cancel·lades:	1	11,11%
Programades i no cancel·lades	8	88,89%
Iniciades:	8	100,00%
Programades i no iniciades a 31/12/2025	0	0,00%
Avançades a l'inici programat	0	0,00%
Completades a 31/12/2025	2	25,00%

Estat d'execució a 31/12/2025






ODS vinculats:



Núm	Acció	Comentari	Prev. actualitzada		Execució		Estat d'execució				Canc.
			Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació		
041	Continuar apostant pel suport econòmic per la participació en sortides i colònies dels centres educatius en els convenis i subvencions anuals.	L'acció es desenvolupa segons allò previst. L'instrument bàsic és la subvenció als centres educatius, ja que es procura que aquests destinin l'aportació municipal a aquesta finalitat..	01/2024	06/2027	01/2024		59%	59%		<input type="checkbox"/>	
109	Donar a conèixer l'oferta d'ensenyaments artístics a les entitats i establiments del municipi relacionats amb aquest àmbit i al conjunt del veïnat.	L'acció s'executa amb normalitat en el marc del Projecte Educatiu del Masnou (PEM) i amb instruments com la Guia Educativa.	09/2023	06/2027	09/2023		61%	61%		<input type="checkbox"/>	
131	Continuar oferint programes d'aprenentatge, ocupació i inserció laboral per al jovent, com «Primeres oportunitats», Formació Professional Dual i similars.	Des de la regidoria d'Educació es proposa fusionar aquesta acció amb la número 140, ja que l'objecte és concurrent. Per tant, es cancel·la.	01/2024	06/2027	01/2024		0%	0%		<input checked="" type="checkbox"/>	
132	Consolidar el Projecte Educatiu del Municipi (PEM) i fer-ne el seguiment de la seva aplicació amb tota la comunitat educativa.	L'acció s'està executant d'acord amb allò previst. Els grups de Joventut i de Pantalles s'han creat i es troben periòdicament per coordinar les accions que hi estan relacionades (Podcast Jove, Vida extra...).	01/2024	06/2027	01/2024		57%	57%		<input type="checkbox"/>	
135	Augmentar un grup d'I2 a l'etapa infantil 0-3 de les escoles bressol al curs 2023-2024 i estudiar l'ampliació de l'oferta educativa d'aquesta etapa per als cursos següents.	L'execució de l'acció segueix les previsions. S'ha fet increment del grup d'I2 a l'escola bressol Sol Solet i s'està treballant en un projecte d'augmentar dos grups a l'escola bressol La Barqueta.	09/2023	06/2027	09/2023		61%	61%		<input type="checkbox"/>	
139	Treballar amb l'administració educativa per tal d'adaptar l'oferta de formació professional.	L'àmbit gestor considera que l'actuació ha estat completada. S'ha traslladat a l'Institut Maremar i a l'IMES un informe elaborat per Promoció Econòmica en el qual s'hi fa constar la demanda de personal al municipi, la prioritització de la formació del SOC, l'oferta formativa actual i les dades d'ocupació de la comarca, amb l'objectiu que es tingui en compte per la planificació de l'oferta formativa. A més, l'Ajuntament s'ha ofert a trobar-se amb els dos centres educatius per poder aprofundir en aquest àmbit.	12/2024	06/2027	12/2024	12/2025	42%	100%		<input type="checkbox"/>	

3040 Educació




Núm	Acció	Comentari	Prev. actualitzada		Execució		Estat d'execució			
			Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
140	Buscar nova oferta educativa d'ensenyaments postobligatoris presencials en formació professional i programes d'inserció laboral com l'FP Dual.	La regidoria d'Educació proposa la fusió d'aquesta acció amb la número 131, ja que coincideixen en el seu contingut pràctic.	01/2024	06/2027	01/2024		57%	57%		<input type="checkbox"/>
141	Continuar formant part de la xarxa NOE (Noves oportunitats educatives) de la Diputació de Barcelona	L'acció es desenvolupa d'acord amb les previsions, amb l'afegit que el CFPAM ja no ofereix aquest curs 26/27 els ensenyaments de català finançats per la xarxa NOE, sinó únicament els de castellà i la formació instrumental.	09/2023	06/2027	09/2023		61%	61%		<input type="checkbox"/>
142	Instar la Generalitat de Catalunya a posar en marxa una Escola Oficial d'Idiomes (EOI) al Masnou.	L'àmbit gestor considera que l'acció ha estat completada. Des de març de 2025 s'ha instat a la Generalitat a posar en marxa una escola d'idiomes al Masnou, ara per ara, sense resultat favorable.	01/2025	12/2025	01/2025	12/2025	100%	100%		<input type="checkbox"/>

Estat d'execució per regidories a 31/12/2025

3050 Esports

Accions	Nombre	%
Planificades:	10	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	10	100,00%
Iniciades:	8	80,00%
Programades i no iniciades a 31/12/2025	2	20,00%
Avançades a l'inici programat	0	0,00%
Completades a 31/12/2025	3	30,00%

Estat d'execució a 31/12/2025

Previst	Real	Situació
79,50% 	59,50% 	

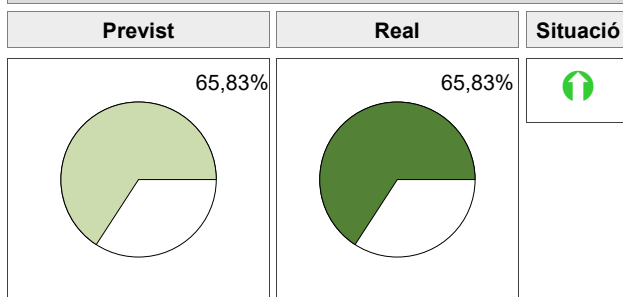


3050 Esports

34111 Programes i activitats esportives.

Accions	Nombre	%
Planificades:	6	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	6	100,00%
Iniciades:	6	80,00%
Programades i no iniciades a 31/12/2025	0	20,00%
Avançades a l'inici programat	0	0,00%
Completades a 31/12/2025	1	30,00%

Estat d'execució a 31/12/2025



ODS vinculats:






Núm	Acció	Comentari	Prev. actualitzada		Execució		Estat d'execució				Canc.
			Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació		
016	Crear nous circuits saludables i punts de pràctica esportiva, tenint especialment en compte l'oci infantil i juvenil, al parc Vallmora i al passeig Marítim.	El circuit del Parc Vallmora s'ha acabat en desembre de 2025 i ja es troba en ple ús.	01/2024	06/2027	01/2024		59%	59%		<input type="checkbox"/>	
038	Aprofundir la col·laboració amb The Ricky Rubio Foundation en les seves iniciatives solidàries.	Segons indica l'àmbit gestor, la col·laboració amb la fundació continua amb normalitat.	01/2024	06/2027	01/2024		59%	59%		<input type="checkbox"/>	
049	Crear i impulsar una instància de relació, deliberació i comunicació que impliqui l'Ajuntament i els clubs esportius de la vila.	Al 2025 s'han fet reunions per abordar temes com el protocol de seguretat en equipaments esportius, les ocupacions i usos, i les explicatives sobre subvencions. Es considera que l'acció ha estat completada.	04/2024	12/2024	04/2024	06/2025	100%	100%		<input type="checkbox"/>	
051	Continuar el projecte «Esport blau» per potenciar la pràctica d'esports nàutics.	El nou conveni s'ha aprovat el 23 d'octubre de 2025. L'activitat de piscina ha estat afectada, degut a les obres pel canvi de coberta a la piscina. L'activitat de vela si s'ha fet.	01/2024	06/2027	01/2024		59%	59%		<input type="checkbox"/>	
052	Elaborar i impulsar un projecte per atreure esdeveniments esportius al municipi.	Les actuacions es desenvolupen segons allò previst. Per 2026 s'està estudiant l'impuls de diverses activitats: competició de JUDO infantil (juny), competició de CROSSFIT i cursos d'orientació per famílies.	01/2024	06/2027	01/2024		59%	59%		<input type="checkbox"/>	
053	Promoure la pràctica dels escacs, col·laborant en l'organització de tornejos i creant una zona per a la pràctica a l'aire lliure.	El 22 de febrer de 2025 es van inaugurar dues taules d'escacs exteriors al Parc Vallmora, prop de la guingueta. Es va organitzar una jornada oberta a les famílies, liderada pel Club d'Escacs El Masnou. Des del departament d'Esports es van comprar dos jocs de fitxes grans per a jugar al llarg de l'any, que estan en règim de préstec gestionat per la guingueta. Així mateix, es va proporcionar material al Club per a fer tallers durant la jornada. Per tant, es considera que l'execució de l'acció es troba al dia.	01/2024	06/2027	01/2024		59%	59%		<input type="checkbox"/>	





3050 Esports
34200 Instal·lacions esportives.

Accions	Nombre	%
Planificades:	4	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	4	100,00%
Iniciades:	2	80,00%
Programades i no iniciades a 31/12/2025	2	20,00%
Avançades a l'inici programat	0	0,00%
Completades a 31/12/2025	2	30,00%

Estat d'execució a 31/12/2025

Previst	Real	Situació
100,00%	50,00%	
		

ODS vinculats:





Núm	Acció	Comentari	Prev. actualitzada		Execució		Estat d'execució				Canc.
			Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació		
050	Fer un pla de millora dels espais esportius a l'aire lliure.	Es preveu que l'acció, en el marc del MIEM, s'executarà en 2026.	01/2025	12/2025			100%	0%		<input type="checkbox"/>	
055	Finalitzar el nou gimnàs amb màquines per a la pràctica esportiva individual en el segon pis del Complex esportiu.	L'acció s'ha completat amb el condicionament de l'espai d'acord amb allò programat.	09/2023	02/2024	09/2023	02/2024	100%	100%		<input type="checkbox"/>	
056	Crear una nova sala al Complex esportiu, per a la pràctica de l'activitat dirigida de ciclisme de sala.	El dia 2 de juny de 2025 es va inaugurar la sala d'spinning i es van començar a fer sessions tant virtuals com amb monitoratge. Les reserves es fan mitjançant el web d'Esports amb l'aplicatiu informàtic Matchpoint, com en el cas de la resta de reserves del Complex. Es considera que l'acció s'ha completat.	01/2024	12/2024	01/2024	06/2025	100%	100%		<input type="checkbox"/>	
057	Estudiar la viabilitat i, en el seu cas, planificar una pista d'atletisme mancomunada entre els municipis del Masnou, Alella i Teià.	No s'ha dut a terme cap actuació al respecte.	01/2025	12/2025			100%	0%		<input type="checkbox"/>	

Estat d'execució per regidories a 31/12/2025

3062 Gent gran

Accions	Nombre	%
Planificades:	2	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	1	50,00%
Iniciades:	1	100,00%
Programades i no iniciades a 31/12/2025	0	0,00%
Avançades a l'inici programat	1	50,00%
Completades a 31/12/2025	0	0,00%




Estat d'execució a 31/12/2025

Previst	Real	Situació
<p>20,00%</p> 	<p>37,50%</p> 	



3062 Gent gran
23122 Gent gran.

Accions	Nombre	%
Planificades:	2	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	1	50,00%
Iniciades:	1	100,00%
Programades i no iniciades a 31/12/2025	0	0,00%
Avançades a l'inici programat	1	50,00%
Completades a 31/12/2025	0	0,00%

Estat d'execució a 31/12/2025

Previst	Real	Situació
20,00%	37,50%	
		

ODS vinculats:





Núm	Acció	Comentari	Prev. actualitzada		Execució		Estat d'execució			
			Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
122	Reforçar la programació de l'agenda de la gent gran promovent les activitats intergeneracionals.	El 16 de novembre de 2025 es va dur a terme la jornada intergeneracional sobre l'edatisme, implicant una escola de ball del Masnou i els seus alumnes, músics del municipi, personal voluntari i usuari d'El Masnou Cuida, així com públic de totes les edats. També s'ha consolidat la col·laboració amb el Casal de Gent Gran de Cal Ros, a Ocata, en el marc del projecte Sostre 360.	01/2025	06/2027	10/2024		40%	40%		<input type="checkbox"/>
123	Elaborar un pla per l'actualització dels usos i els serveis dels casals de gent gran municipals.	Durant 2025 la Diputació de Barcelona ha concedit un recurs per fer l'estudi del funcionament dels casals; els treballs s'han iniciat el passat mes de juliol. En paral·lel, s'han començat els treballs per elaborar uns estatuts estandaritzats per als 3 casals. Tenint això en compte, l'execució real de l'acció s'ha avançat a les previsions.	01/2026	12/2026	06/2025		0%	35%		<input type="checkbox"/>

Estat d'execució per regidories a 31/12/2025

3080 Igualtat

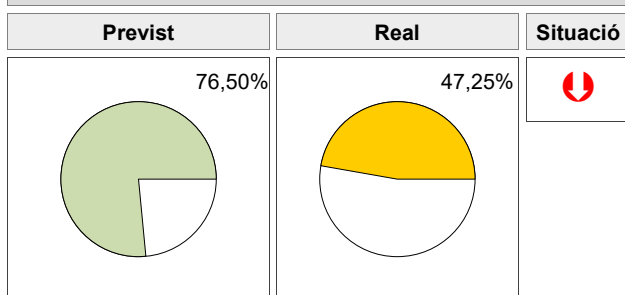
Accions	Nombre	%
Planificades:	4	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	4	100,00%
Iniciades:	3	75,00%
Programades i no iniciades a 31/12/2025	1	25,00%
Avançades a l'inici programat	0	0,00%
Completades a 31/12/2025	0	0,00%





Estat d'execució a 31/12/2025

Previst	Real	Situació
<p>76,50%</p> 	<p>47,25%</p> 	

3080 Igualtat
23128 Igualtat.

Accions	Nombre	%
Planificades:	4	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	4	100,00%
Iniciades:	3	75,00%
Programades i no iniciades a 31/12/2025	1	25,00%
Avançades a l'inici programat	0	0,00%
Completades a 31/12/2025	0	0,00%

Estat d'execució a 31/12/2025

ODS vinculats:





Núm	Acció	Comentari	Prev. actualitzada		Execució		Estat d'execució			
			Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
031	Ampliar el programa de coeducació que es va impulsar amb caràcter pilot el curs 2022-2023.	Durant l'any 2025 el projecte ha continuat desenvolupant-se amb normalitat. En l'últim trimestre de l'any s'ha iniciat la fase 2 del projecte als dos centres participants.	01/2024	06/2027	01/2024		57%	57%		<input type="checkbox"/>
032	Estudiar la viabilitat de destinar un espai per a la Casa de la Igualtat, que així mateix actuï com a centre LGTBIQ+.	El projecte s'iniciarà l'any 2026.	01/2025	01/2026			92%	0%		<input type="checkbox"/>
033	Revisar el protocol d'assetjament sexual, violència masclista i LGTBIfòbia.	Durant l'any 2025 s'ha treballat amb el Grup de Treball de Prevenció i Sensibilització de la Comissió Tècnica del Circuit d'abordatge a les violències masclistes de vegueria de Barcelona així com Comissió Tècnica del Circuit d'abordatge de les violències masclistes de la vegueria de Barcelona. També s'ha creat el grup de prevenció del protocol d'abordatge violència masclista del Consell Comarcal. L'execució de l'acció s'estendrà durant tot l'any 2026; es preveu l'adhesió al protocol del Consell Comarcal quan aquest s'hagi elaborat i aprovat.	01/2025	12/2025	09/2024		100%	75%		<input type="checkbox"/>
120	Posar noms de dones a carrers i places noves del municipi o a espais urbans (jardins, placetes, parcs...) encara no denominats.	L'acció s'ha desenvolupat durant 2025 d'acord amb el calendari previst.	01/2024	06/2027	01/2024		57%	57%		<input type="checkbox"/>

Estat d'execució per regidories a 31/12/2025

3091 Infància i joventut

Accions	Nombre	%
Planificades:	6	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	5	83,33%
Iniciades:	5	100,00%
Programades i no iniciades a 31/12/2025	0	0,00%
Avançades a l'inici programat	0	0,00%
Completades a 31/12/2025	0	0,00%




Estat d'execució a 31/12/2025

Previst	Real	Situació
<p>53,50%</p> 	<p>45,17%</p> 	




3091 Infància i joventut
23125 Joventut.

Accions	Nombre	%
Planificades:	3	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	2	83,33%
Iniciades:	2	100,00%
Programades i no iniciades a 31/12/2025	0	0,00%
Avançades a l'inici programat	0	0,00%
Completades a 31/12/2025	0	0,00%

Estat d'execució a 31/12/2025

Previst	Real	Situació
51,33%	34,67%	
		

ODS vinculats:


Núm	Acció	Comentari	Prev. actualitzada		Execució		Estat d'execució				Canc.
			Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació		
107	Desenvolupar una programació artística jove i implantar ajuts, com el premi a la Creació Jove.	S'han elaborat les bases específiques per a la convocatòria d'un Premi a la Creació Jove.	04/2024	06/2027	04/2024		54%	54%		<input type="checkbox"/>	
121	Posar a disposició de la Generalitat espais susceptibles de dur a terme camps de treballs mancomunats de descoberta de patrimoni cultural i ecològic de la vila.	L'acció s'inicia el 2026. Es preveu una coordinació amb l'àmbit de Patrimoni i treballar inicialment a l'entorn de la Cella Vinària.	01/2026	06/2027			0%	0%		<input type="checkbox"/>	
160	Crear un òrgan de participació del jovent, l'Ajuntament Jove, que s'impliqui tant en la gestió com en la dinamització de l'Espai Jove de ca n'Humet.	Des del 16 de juny de 2025 s'està elaborant el Pla Local de Joventut amb el suport de la Diputació de Barcelona. S'han dut a terme les fases de diagnosi i propositiva i actualment s'està ja a la fase final. Es preveu disposar del Pla a mitjans de 2026. El Pla preveurà creació d'un òrgan de participació juvenil.	03/2024	05/2024	03/2024		100%	50%		<input type="checkbox"/>	



3091 Infància i joventut

23126 Infància.

Accions	Nombre	%
Planificades:	1	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	1	83,33%
Iniciades:	1	100,00%
Programades i no iniciades a 31/12/2025	0	0,00%
Avançades a l'inici programat	0	0,00%
Completades a 31/12/2025	0	0,00%

Estat d'execució a 31/12/2025

Previst	Real	Situació
51,00%	51,00%	

ODS vinculats:




Núm	Acció	Comentari	Prev. actualitzada		Execució		Estat d'execució			
			Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
137	Consolidar una agenda de la infància que inclogui totes les activitats, espais i iniciatives adreçades als infants i llurs famílies al llarg de l'any.	L'agenda s'ha publicat inicialment el mes de maig de 2025 i es va actualitzant periòdicament.	06/2024	06/2027	06/2024		51%	51%		<input type="checkbox"/>

3091 Infància i joventut

32611 Promoció educativa.


Accions	Nombre	%
Planificades:	1	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	1	83,33%
Iniciades:	1	100,00%
Programades i no iniciades a 31/12/2025	0	0,00%
Avançades a l'inici programat	0	0,00%
Completades a 31/12/2025	0	0,00%

Estat d'execució a 31/12/2025

Previst	Real	Situació
59,00%	59,00%	

ODS vinculats:




Núm	Acció	Comentari	Prev. actualitzada		Execució		Estat d'execució			
			Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
130	Reforçar l'oferta existent d'aules d'estudi en els períodes d'exàmens.	L'acció es desenvolupa segons allò previst. El primer semestre de 2025 s'ha reforçat l'aula d'estudi a la Biblioteca fora d'horari habitual, oferint obertura entre setmana i cap de setmana en horari nocturn. També s'ha ampliat l'oferta d'aula estudi a Ca n'Humet en horari d'obertura de l'Espai Jove, de dilluns a dissabte de 16.30 a 20.30 h.	01/2024	06/2027	01/2024		59%	59%		<input type="checkbox"/>


3091 Infància i joventut
32700 Foment del civisme i equipaments cívics municipals.

Accions	Nombre	%
Planificades:	1	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	1	83,33%
Iniciades:	1	100,00%
Programades i no iniciades a 31/12/2025	0	0,00%
Avançades a l'inici programat	0	0,00%
Completades a 31/12/2025	0	0,00%

Estat d'execució a 31/12/2025

Previst	Real	Situació
57,00%	57,00%	



ODS vinculats:


Núm	Acció	Comentari	Prev. actualitzada		Execució		Estat d'execució			
			Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
183	Oferir espais a equipaments cívics per la realització d'activitats d'entitats i col·lectius d'infància i famílies.	L'acció s'ha executat durant 2025 segons les previsions. Durant el primer semestre s'ha continuat impulsant la flexibilitat i l'establiment de nous protocols per afavorir la realització d'activitats per part de les entitats i col·lectius d'infància i famílies, utilitzant equipaments com la sala polivalent de La Barqueta, Els Vienesos, Masovers i carrer Paraguai.	01/2024	06/2027	01/2024		57%	57%		<input type="checkbox"/>

3101 Benestar animal, salut pública i consum

Accions	Nombre	%
Planificades:	7	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	7	100,00%
Iniciades:	7	100,00%
Programades i no iniciades a 31/12/2025	0	0,00%
Avançades a l'inici programat	0	0,00%
Completades a 31/12/2025	0	0,00%

Estat d'execució a 31/12/2025

Previst	Real	Situació
<p>56,57%</p> 	<p>56,57%</p> 	<p>↑</p>

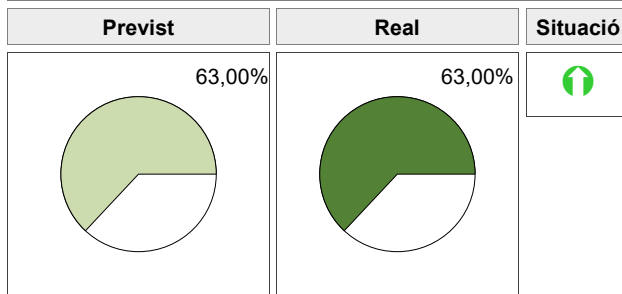


3101 Benestar animal, salut pública i consum

31112 Sanitat ambiental

Accions	Nombre	%
Planificades:	1	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	1	100,00%
Iniciades:	1	100,00%
Programades i no iniciades a 31/12/2025	0	0,00%
Avançades a l'inici programat	0	0,00%
Completades a 31/12/2025	0	0,00%

Estat d'execució a 31/12/2025



ODS vinculats:




Núm	Acció	Comentari	Prev. actualitzada		Execució		Estat d'execució			
			Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
021	Subvencionar la realització de proves per detectar l'existència de gas radó a les llars.	S'avança dos mesos la data d'acabament de l'acció, a abril de 2027. L'estudi corresponent al període 2024-25 va finalitzar i la Diputació va concedir la subvenció per l'estudi 2025-26, que s'ha realitzat entre els mesos d'octubre de 2025 i gener de 2026, aproximadament. En el moment de fer aquesta avaluació s'està a l'espera de rebre els resultats. Així mateix, s'ha fet una campanya informativa a la població i s'ha complert l'objectiu de proveir de detectors a la ciutadania per fer els mesuraments a casa seva.	10/2023	04/2027	10/2023		63%	63%		<input type="checkbox"/>







3101 Benestar animal, salut pública i consum
31113 Benestar animal i control d'animals de companyia

Accions	Nombre	%
Planificades:	6	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	6	100,00%
Iniciades:	6	100,00%
Programades i no iniciades a 31/12/2025	0	0,00%
Avançades a l'inici programat	0	0,00%
Completades a 31/12/2025	0	0,00%

Estat d'execució a 31/12/2025

Previst	Real	Situació
55,50%	55,50%	

ODS vinculats:





Núm	Acció	Comentari	Prev. actualitzada		Execució		Estat d'execució			
			Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
161	Fer una esterilització massiva de les gateres i gats de la gatera per controlar la massificació.	Els gats de la gatera s'esterilitzen de forma regular a mida que van entrant i tenen l'edat adequada.	11/2023	05/2027	11/2023		61%	61%		<input type="checkbox"/>
162	Dignificar els diferents punts d'alimentació per als gats existents a diferents llocs del municipi.	Durant l'any 2025 s'han adquirit quatre casetes per posar a sengles punts d'alimentació. Així mateix, s'ha millorat la neteja i el desbrossament dels espais on estan els punts d'alimentació.	06/2024	05/2027	06/2024		53%	53%		<input type="checkbox"/>
163	Fer una vegada a l'any la Fira de Benestar Animal on l'Ajuntament donarà veu a les entitats que vetllen i treballen pel benestar animal.	S'allarga un mes la data final d'execució, fins novembre de 2026. La segona edició de la Fira es va fer el dia 9 de novembre de 2025.	10/2024	11/2026	10/2024		58%	58%		<input type="checkbox"/>
164	Crear una platja de gossos digna que doni cobertura durant la temporada de bany a les persones usuàries.	L'acció es desenvolupa segons les previsions. S'ha establert com a platja per gossos definitiva un sector a la platja d'Ocata, entre el carrer del Dr. Botey i l'avinguda de Joan Maragall. Per a la gestió s'ha fet la contractació del muntatge i desmuntatge de les tanques de delimitació i del manteniment del material.	06/2024	06/2027	06/2024		51%	51%		<input type="checkbox"/>
165	Fer una campanya de coneixement de la nova legislació sobre benestar animal i de conscienciació social sobre la tinença d'animals de companyia.	Durant l'any 2025 s'ha fet una campanya de tinença responsable d'animals, enfocada a la recollida d'excrements, la neteja dels orins i a portar els gossos lligats. S'han fet vídeos per les xarxes socials i s'ha col·locat senyals.	01/2024	06/2027	01/2024		57%	57%		<input type="checkbox"/>
167	Donar suport a les entitats animalistes i dotar de més recursos les protectores i les gestores de colònies felines.	Durant l'any 2025 s'han mantingut les subvencions a les entitats col·laboradores en aquesta acció (amb un increment de 1.000,00 €) i s'han realitzat inversions de millora de la gatera.	06/2024	05/2027	06/2024		53%	53%		<input type="checkbox"/>

Estat d'execució per regidories a 31/12/2025

3110 Salut comunitària

Accions	Nombre	%
Planificades:	7	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	7	100,00%
Iniciades:	6	85,71%
Programades i no iniciades a 31/12/2025	1	14,29%
Avançades a l'inici programat	0	0,00%
Completades a 31/12/2025	1	14,29%

Estat d'execució a 31/12/2025

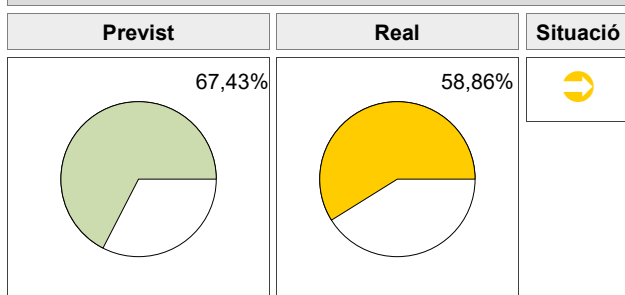
Previst	Real	Situació
<p>67,43%</p> 	<p>58,86%</p> 	

3110 Salut comunitària

31121 Promoció de la salut comunitària.








Accions	Nombre	%
Planificades:	7	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	7	100,00%
Iniciades:	6	85,71%
Programades i no iniciades a 31/12/2025	1	14,29%
Avançades a l'inici programat	0	0,00%
Completades a 31/12/2025	1	14,29%

Estat d'execució a 31/12/2025



ODS vinculats:






Núm	Acció	Comentari	Prev. actualitzada		Execució		Estat d'execució				Canc.
			Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació		
014	Actualitzar el protocol que reculli les actuacions col·laboratives que es desenvolupen entre les escoles bressol municipals i el Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP).	Es modifica el nom o títol de l'acció, canviant "Elaborar un [...]" per "Actualitzar el [...]". S'ha treballat una proposta amb el CDIAP per actualitzar el protocol de col·laboració que ja es venien aplicant. Aquesta proposta s'acabarà de revisar tècnicament durant la primera meitat de 2026.	01/2025	12/2025	09/2025		100%	80%		<input type="checkbox"/>	
017	Impulsar programes de prescripció social en col·laboració amb la Taula de Salut Mental, la Taula de Salut Comunitària i els centres de salut del municipi.	L'acció s'ha desenvolupa amb normalitat durant 2025. En tot cas, s'afiança com acció dins del Pla local de Salut amb la validació de les Taules de Salut Mental i Comunitària.	01/2024	06/2027	01/2024		57%	57%		<input type="checkbox"/>	
018	Continuar potenciant el projecte 'El Masnou cuida' per detectar casos de persones grans que pateixen soledat no volguda i fer-ne el seguiment.	L'acció s'ha desenvolupat durant 2025 segons allò previst.	01/2024	06/2027	01/2024		57%	57%		<input type="checkbox"/>	
025	Participar en les iniciatives que s'impulsen des de les associacions de familiars d'alumnes i els centres escolars per abordar la problemàtica de l'assetjament escolar als centres educatius.	L'acció s'ha desenvolupat amb normalitat durant el primer semestre del 2025 i es dona per completada.	09/2024	06/2025	09/2024		100%	100%		<input type="checkbox"/>	
026	Continuar realitzant activitats en centres d'educació primària i secundària per tal de afrontar l'ansietat davant situacions difícils, en col·laboració amb el Centre de Salut Mental del Masnou.	L'acció s'ha desenvolupat amb normalitat durant l'any 2025.	09/2023	06/2027	09/2023		61%	61%		<input type="checkbox"/>	
028	Fer difusió de la xarxa de refugis climàtics a equipaments municipals per fer front a les onades de calor i de fred, i altres efectes del canvi climàtic.	L'acció s'ha desenvolupat amb normalitat durant l'any 2025. S'ha incorporat a la xarxa un nou equipament civíc al Cul d'Ocata. Així mateix, s'han actualitzat els horaris d'obertura i s'ha fet difusió per xarxes, al web municipal i a la xarxa de refugis climàtics del Departament d'Interior de la Generalitat.	01/2024	06/2027	01/2024		57%	57%		<input type="checkbox"/>	
083	Analitzar la cartera d'actuacions de salut comunitària per determinar la viabilitat econòmica d'oferir nous serveis o incrementar l'abast dels ja existents.	L'acció no s'ha iniciat en 2025. Es preveu sol·licitar suport de la Diputació de Barcelona per la seva execució durant el primer semestre de 2026.	01/2025	06/2027			40%	0%		<input type="checkbox"/>	

Estat d'execució per regidories a 31/12/2025

3121 Solidaritat i cooperació

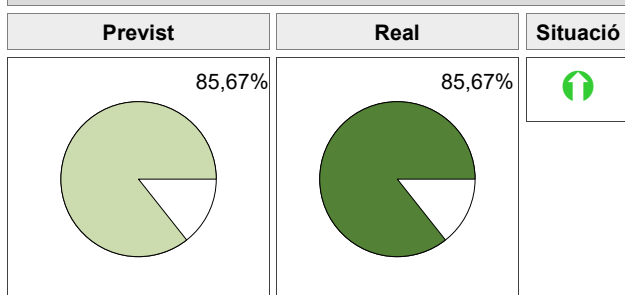
Accions	Nombre	%
Planificades:	4	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	4	100,00%
Iniciades:	4	100,00%
Programades i no iniciades a 31/12/2025	0	0,00%
Avançades a l'inici programat	0	0,00%
Completades a 31/12/2025	2	50,00%




Estat d'execució a 31/12/2025

Previst	Real	Situació
<p>74,25%</p> 	<p>74,25%</p> 	

3121 Solidaritat i cooperació
23123 Acollida i integració a persones estrangeres immigrades.

Accions	Nombre	%
Planificades:	3	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	3	100,00%
Iniciades:	3	100,00%
Programades i no iniciades a 31/12/2025	0	0,00%
Avançades a l'inici programat	0	0,00%
Completades a 31/12/2025	2	50,00%

Estat d'execució a 31/12/2025

ODS vinculats:



Núm	Acció	Comentari	Prev. actualitzada		Execució		Estat d'execució				Canc.
			Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació		
034	Crear una bústia per a la no discriminació i les garanties de dret.	La Bustia de Drets es va posar en marxa el 9 de desembre de 2025. S'ha fet una campanya de difusió a través de xarxes socials, el canal whatsapp de ciutadania; així mateix, durant les activitats de la Setmana dels Drets Humans es van repartir flyers informatius.	02/2025	06/2025	09/2025	12/2025	100%	100%		<input type="checkbox"/>	
035	Celebrar i commemorar de les dates assenyalades i importants per la causa antiracista i de la diversitat cultural.	L'any 2025 s'han anat executant les activitats programades per commemorar dates fins al mes de juny. S'han fet activitats per al Dia Internacional en memòria de les víctimes de l'Holocaust amb els instituts del municipi i s'ha celebrat la Festa de la Diversitat, el 17 de maig, per commemorar la diversitat cultural. Al desembre 2025 es van realitzar diferents activitats en el context de la setmana dels Drets Humans: camp de refugiats, representació teatre infantil Peix Irissat, exposició i visita guiada DJOUMA i cinema "Adú".	01/2024	06/2027	01/2024		57%	57%		<input type="checkbox"/>	
037	Crear la Taula de diàleg de Solidaritat i de les persones migrades.	S'ha portat a terme la primera convocatòria de la Taula de diàleg de Solidaritat i de les persones migrades a data 29 d'abril. La Taula s'ha reunit durant 2025 també els dies 17 de juny, 15 de setembre i 2 de desembre.	06/2024	07/2025	06/2024	06/2025	100%	100%		<input type="checkbox"/>	

3121 Solidaritat i cooperació

23124 Solidaritat i cooperació.


Accions	Nombre	%
Planificades:	1	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	1	100,00%
Iniciades:	1	100,00%
Programades i no iniciades a 31/12/2025	0	0,00%
Avançades a l'inici programat	0	0,00%
Completades a 31/12/2025	0	50,00%

Estat d'execució a 31/12/2025

Previst	Real	Situació
40,00%	40,00%	

ODS vinculats:





Núm	Acció	Comentari	Prev. actualitzada		Execució		Estat d'execució			
			Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
036	Augmentar anualment el pressupost municipal destinat a projectes de cooperació al desenvolupament sostenible i la solidaritat global.	En 2025 la despesa executada ha passat de 27.870,00 € a 33.000,00 €. Es preveu que aquest import augmenti en 2026.	01/2025	06/2027	01/2025		40%	40%		<input type="checkbox"/>

Estat d'execució per regidories a 31/12/2025

3130 Accessibilitat i diversitat funcional

Accions	Nombre	%
Planificades:	3	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	3	100,00%
Iniciades:	3	100,00%
Programades i no iniciades a 31/12/2025	0	0,00%
Avançades a l'inici programat	0	0,00%
Completades a 31/12/2025	0	0,00%

Estat d'execució a 31/12/2025

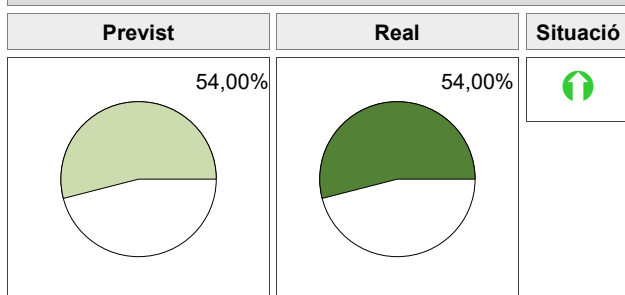
Previst	Real	Situació
<p>54,00%</p> 	<p>54,00%</p> 	<p>↑</p>

3130 Accessibilitat i diversitat funcional

23127 Persones amb diversitat funcional.




Accions	Nombre	%
Planificades:	3	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	3	100,00%
Iniciades:	3	100,00%
Programades i no iniciades a 31/12/2025	0	0,00%
Avançades a l'inici programat	0	0,00%
Completades a 31/12/2025	0	0,00%

Estat d'execució a 31/12/2025



ODS vinculats:






Núm	Acció	Comentari	Prev. actualitzada		Execució		Estat d'execució			
			Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
174	Desenvolupar un programa específic d'atenció i suport a les persones amb diversitat funcional que tingui en compte aspectes com l'accessibilitat a l'espai públic.	L'acció s'ha desenvolupat durant 2025 segons el calendari previst. S'han donat a conèixer les conclusions i propostes del Grup de treball per l'accessibilitat visual i sensorial als departaments interessats. També s'ha iniciat l'elaboració del Pla d'acció de l'àmbit de la discapacitat, que contempla diverses accions tractores.	01/2025	06/2027	01/2025		40%	40%		<input type="checkbox"/>
175	Incorporar pictogrames en tots els espais de comunicació municipal.	L'acció s'ha desenvolupa durant 2025 d'acord amb allò temporitzat i segons el calendari previst.	09/2023	06/2027	09/2023		61%	61%		<input type="checkbox"/>
203	Dotar-se dels recursos necessaris per oferir atenció en llengua de signes des dels diferents àmbits d'atenció a la ciutadania.	Durant l'any 2025 s'ha continuat treballant sobre la línia b) "garantir la presència d'interprets de signes en les activitats que organitza l'Ajuntament".	09/2023	06/2027	09/2023		61%	61%		<input type="checkbox"/>

Estat d'execució per regidories a 31/12/2025

4011 Transició ecològica i desenvolupament sostenible

Accions	Nombre	%
Planificades:	21	
Cancel·lades:	1	4,76%
Programades i no cancel·lades	17	80,95%
Iniciades:	15	88,24%
Programades i no iniciades a 31/12/2025	2	11,76%
Avançades a l'inici programat	0	0,00%
Completades a 31/12/2025	4	23,53%


Estat d'execució a 31/12/2025

Previst	Real	Situació
<p>51,86%</p> 	<p>40,19%</p> 	



4011 Transició ecològica i desenvolupament sostenible
16100 Abastament domiciliari d'aigua potable.

Accions	Nombre	%
Planificades:	2	
Cancel·lades:	0	4,76%
Programades i no cancel·lades	1	80,95%
Iniciades:	1	88,24%
Programades i no iniciades a 31/12/2025	0	11,76%
Avançades a l'inici programat	0	0,00%
Completades a 31/12/2025	1	23,53%

Estat d'execució a 31/12/2025

Previst	Real	Situació
50,00%	50,00%	




ODS vinculats:


Núm	Acció	Comentari	Prev. actualitzada		Execució		Estat d'execució			
			Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
022	Fer un pla per la progressiva substitució de les canonades de fibrociment a la xarxa de distribució d'aigua potable municipal.	Tot i que l'elaboració del Pla és prevista per l'any 2026, quan la gestió del servei ja es farà de la societat municipal SUMEM, s'ha anat invertint en la substitució de canonades en les obres fetes, per exemple durant 2025, als carrers d'Amadeu I, Fra Juniper Serra, Pere Grau i Capitans Comellas, al dipòsit d'aigua del costat del cementiri, i al passeig de Roman Fabra. La Diputació ha concedit una subvenció de 427.500 euros i l'ACA una altra per import de 63.457,46 euros. D'altra banda AGBAR ha realitzat canvis de canonades en tres carrers del municipi.	06/2026	06/2027			0%	0%		<input type="checkbox"/>
077	Desenvolupar la gestió directa pública de l'aigua per tal que inclogui els valors de sostenibilitat.	El dia 1 de novembre de 2025 SUMEM va començar a prestar el servei de subministrament d'aigua. L'acció es considera completada.	09/2023	11/2025	09/2023	11/2025	100%	100%		<input type="checkbox"/>


4011 Transició ecològica i desenvolupament sostenible
16210 Recollida de residus.

Accions	Nombre	%
Planificades:	1	
Cancel·lades:	0	4,76%
Programades i no cancel·lades	1	80,95%
Iniciades:	1	88,24%
Programades i no iniciades a 31/12/2025	0	11,76%
Avançades a l'inici programat	0	0,00%
Completades a 31/12/2025	1	23,53%

Estat d'execució a 31/12/2025

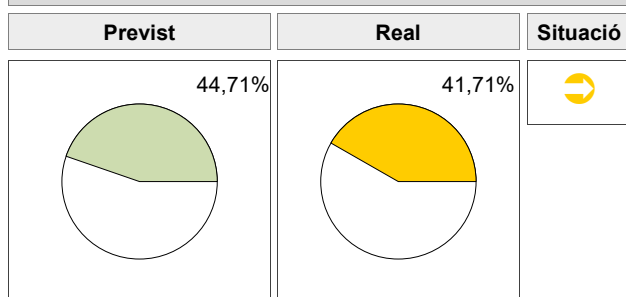
Previst	Real	Situació
100,00%	100,00%	
		






ODS vinculats:


Núm	Acció	Comentari	Prev. actualitzada		Execució		Estat d'execució			
			Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
064	Dissenyar, licitar i adjudicar un nou contracte de neteja viària i recollida de residus.	L'acció es va completar l'any 2024.	01/2024	12/2024	01/2024	12/2024	100%	100%		<input type="checkbox"/>

4011 Transició ecològica i desenvolupament sostenible
17000 Medi ambient.

Accions	Nombre	%
Planificades:	7	
Cancel·lades:	1	4,76%
Programades i no cancel·lades	6	80,95%
Iniciades:	6	88,24%
Programades i no iniciades a 31/12/2025	0	11,76%
Avançades a l'inici programat	0	0,00%
Completades a 31/12/2025	1	23,53%

Estat d'execució a 31/12/2025

ODS vinculats:


Núm	Acció	Comentari	Prev. actualitzada		Execució		Estat d'execució			Canc.
			Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	
029	Adaptar espais verds que puguin complir la funció de refugis climàtics als diferents barris del Masnou.	Durant 2025 s'ha acabat la instal·lació d'umbracles. Es va instal·lar un umbracle al parc de Vallmora i un altre a Cal Ros de les Cabres. També s'ha fet la plantació de 35 arbres al parc de la Nimfa. Per 2026 és previst amb pressupostos participatius instal·lar umbracles a escoles i parcs, en ubicacions pendents de definir.	01/2024	06/2027	01/2024		57%	57%		<input type="checkbox"/>
063	Potenciar les adhesions de diferents serveis municipals i privats al certificat de sostenibilitat Biosphere.	L'acció es desenvolupa d'acord amb les previsions. Hores d'ara, l'Ajuntament té acreditacions Biosphere per l'Oficina de Turisme, el Centre d'Empreses Casa del Marquès, el Museu Municipal de Nàutica i les platges d'Ocata i El Masnou. A més, 7 establiments privats disposen també de la certificació Biosphere. Amb un nombre de 12, El Masnou és un dels municipis del Maresme amb més acreditacions Biosphere, darrere de Pineda de Mar (16) i al mateix nivell de Santa Susanna (també 12). En els plecs per a la nova concessió de les guinguetes de la platja per al 2026, s'ha inclòs com a millora ser un punt referent Biosphere.	09/2023	06/2027	09/2023		61%	61%		<input type="checkbox"/>
076	Implantar mesures com el drenatge urbà, la captació d'aigües freàtiques, la recuperació d'aigües i dels aqüífers.	S'ha arribat un acord amb els propietaris de la Mina Barrera i s'ha renovat el permís de l'ACA per utilitzar l'aigua durant dos anys més. Més endavant s'estudiaran altres opcions.	03/2025	06/2027	09/2025		36%	30%		<input type="checkbox"/>
080	Elaborar una guia de les activitats de l'Ajuntament en l'àmbit de la sostenibilitat.	Per acord de la Junta de Govern Local de 24/10/2024, de revisió del PAM, es va cancel·lar l'acció.	09/2024	06/2027			0%	0%		<input checked="" type="checkbox"/>
081	Incentivar projectes als centres educatius relacionats amb el medi, la sostenibilitat i l'ecologia i incorporar-los a la celebració del Dia Mundial del Medi Ambient.	Durant 2025 s'han realitzat diferents activitats amb les diferents escoles del municipi, com el projecte 50/50 amb l'Escola Marinada.	09/2025	06/2027	09/2025		19%	19%		<input type="checkbox"/>



4011 Transició ecològica i desenvolupament sostenible

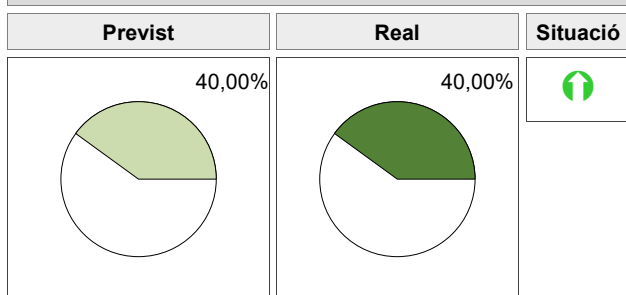
Núm	Acció	Comentari	Prev. actualitzada		Execució		Estat d'execució			Canc.
			Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	
082	Fer accions de divulgació i conscienciació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030 entre els infants i el jovent, com per exemple jocs d'escapada i similars.	S'han realitzat diferents accions durant l'any, però el joc d'escapada no es farà. El crèdit es destinarà a altres actuacions, com podria ser celebrar una fira de segona mà o el reparatruck. Les guinguetes han de realitzar activitats relacionades amb el litoral i la seva conservació.	01/2025	06/2027	01/2025		40%	25%		<input type="checkbox"/>
084	Establir un àmbit de participació sobre transició ecològica, desenvolupament urbà i mobilitat sostenible.	El grup de treball s'ha constituït i ha iniciat la seva activitat. L'acció es considera completada.	01/2024	12/2024	01/2024	12/2025	100%	100%		<input type="checkbox"/>

4011 Transició ecològica i desenvolupament sostenible

17020 Platges.


Accions	Nombre	%
Planificades:	1	
Cancel·lades:	0	4,76%
Programades i no cancel·lades	1	80,95%
Iniciades:	1	88,24%
Programades i no iniciades a 31/12/2025	0	11,76%
Avançades a l'inici programat	0	0,00%
Completades a 31/12/2025	0	23,53%

Estat d'execució a 31/12/2025



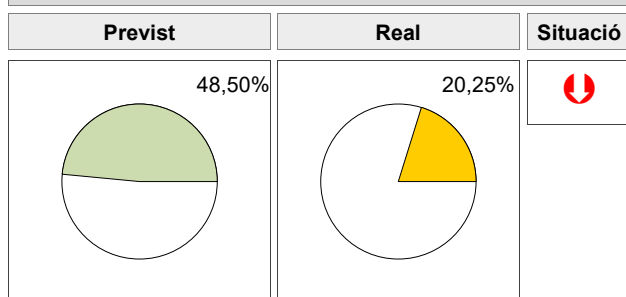
ODS vinculats:







Núm	Acció	Comentari	Prev. actualitzada		Execució		Estat d'execució			
			Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
193	Instal·lar a les platges un sistema de megafonia.	El servei de megafonia s'ha instal·lat durant el 2025 com a prova pilot. Després de valorar positivament l'acció, en 2026 es treballarà en la licitació del servei.	01/2025	06/2027	01/2025		40%	40%		<input type="checkbox"/>

4011 Transició ecològica i desenvolupament sostenible
17100 Parcs, jardins i zones verdes.

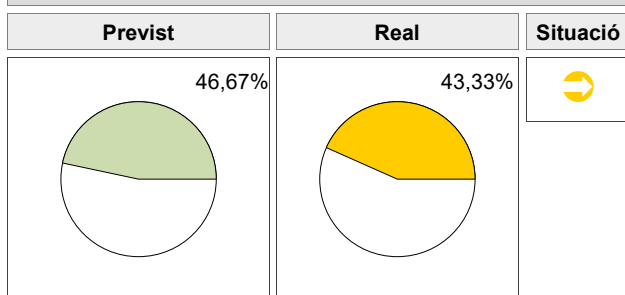
Accions	Nombre	%
Planificades:	4	
Cancel·lades:	0	4,76%
Programades i no cancel·lades	3	80,95%
Iniciades:	2	88,24%
Programades i no iniciades a 31/12/2025	1	11,76%
Avançades a l'inici programat	0	0,00%
Completades a 31/12/2025	0	23,53%




Estat d'execució a 31/12/2025

ODS vinculats:


Núm	Acció	Comentari	Prev. actualitzada		Execució		Estat d'execució				Canc.
			Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació		
048	Crear horts urbans municipals, gestionats amb la participació d'entitats ciutadanes i afavorint el seu ús per joves amb diversitat funcional o persones aturades.	S'ha revisat el conveni signat amb l'associació que gestiona els horts urbans existents. S'ha de refer el llistat de socis i renegociar el conveni. De moment, no hi ha cap entitat interessada en nous horts urbans.	05/2025	04/2027	05/2025		33%	20%		<input type="checkbox"/>	
071	Elaborar un pla de millora de la biodiversitat al municipi.	L'acció no s'ha iniciat. S'ha sol·licitat aquest recurs al catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona del 2026; el recurs és imprescindible tirar endavant aquesta iniciativa, conjuntament amb l'àmbit de Paisatge.	01/2025	12/2025			100%	0%		<input type="checkbox"/>	
072	Impulsar una campanya de recollida de restes vegetals per tal de convertir-les en adob.	L'inici de l'acció és previst per al mes de gener de 2026.	01/2026	06/2027			0%	0%		<input type="checkbox"/>	
073	Dur a terme accions contra el malbaratament alimentari que inclogui l'aprofitament de recursos existents a la vila.	S'han realitzat durant 2025 activitats de sensibilització. L'àmbit d'Educació està treballant amb dues escoles del municipi per tirar endavant un projecte d'aprofitament alimentari.	09/2023	06/2027	09/2023		61%	61%		<input type="checkbox"/>	

4011 Transició ecològica i desenvolupament sostenible
17210 Protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica.

Accions	Nombre	%
Planificades:	3	
Cancel·lades:	0	4,76%
Programades i no cancel·lades	2	80,95%
Iniciades:	2	88,24%
Programades i no iniciades a 31/12/2025	0	11,76%
Avançades a l'inici programat	0	0,00%
Completades a 31/12/2025	1	23,53%


Estat d'execució a 31/12/2025

ODS vinculats:


Núm	Acció	Comentari	Prev. actualitzada		Execució		Estat d'execució				Canc.
			Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació		
019	Estudiar mesures per reduir les molèsties causades per la contaminació acústica.	Durant l'any 2025, amb suport de la Diputació de Barcelona, es van instal·lar sensors per mesurar la qualitat de l'aire i es va pretendre incorporar també una mesura del soroll, però finalment això no ha estat possible. S'ha realitzat per la Diputació un estudi de soroll de la N-II per comparar la situació actual amb la futura pacificació; a la data de l'avaluació l'Ajuntament és pendent de rebre l'informe.	01/2025	06/2027	01/2025		40%	30%		<input type="checkbox"/>	
020	Continuar exigint a la Generalitat de Catalunya la construcció de pantalles acústiques que protegeixin el Masnou Alt i Santa Madrona del soroll de l'autopista.	L'acció es va tancar el desembre de 2024. Amb tot, durant el mes d'abril de 2025 la Diputació de Barcelona ha realitzat una nova sonometria de llarga durada a dos punts afectats pel soroll de l'autopista (c. Badalona i pl. Ramon i Cajal). Els resultats mostren que en aquests dos punts se sobrepassen els nivells d'emissió establerts legalment. S'han enviat els resultats als afectats i al Departament de Territori Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya.	02/2024	12/2024	02/2024	12/2024	100%	100%		<input type="checkbox"/>	
030	Instal·lar sensors de control de la contaminació acústica en certs espais del municipi.	L'inici d'aquesta acció és previst per al mes de gener de 2026. Amb tot, durant 2025 s'ha fet un estudi de soroll a la N-II per la Diputació (a la data de l'avaluació l'Ajuntament és pendent de rebre l'informe). Caldrà decidir si es realitzen estudis en altres punts del municipi o s'actualitza el Mapa de capacitat acústica.	01/2026	05/2027			0%	0%		<input type="checkbox"/>	




4011 Transició ecològica i desenvolupament sostenible
42500 Gestió d'energia fotovoltaica.

Accions	Nombre	%
Planificades:	3	
Cancel·lades:	0	4,76%
Programades i no cancel·lades	3	80,95%
Iniciades:	2	88,24%
Programades i no iniciades a 31/12/2025	1	11,76%
Avançades a l'inici programat	0	0,00%
Completades a 31/12/2025	0	23,53%

Estat d'execució a 31/12/2025

Previst	Real	Situació
67,33%	33,67%	




ODS vinculats:


Núm	Acció	Comentari	Prev. actualitzada		Execució		Estat d'execució			
			Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
061	Impulsar la creació de comunitats energètiques a partir de la implantació de plaques fotovoltaïques en els equipaments públics.	Les obres de substitució de la coberta de la piscina municipal acabaran al juny de 2026, posteriorment s'instal·laran les plaques. Per altra part, s'estan legalitzant les instal·lacions de Ca N'Humet, Escola Ocata, Escola Ferrer i Guàrdia i dipòsit del Cementiri i s'han iniciat els tràmits per oferir el consum compartit.	09/2023	06/2027	09/2023		61%	61%		<input type="checkbox"/>
062	Crear punts de recàrrega elèctrica de vehicles, a partir de l'energia neta generada per plaques fotovoltaïques ubicades a equipaments municipals.	S'ha aprovat el conveni amb l'ATM i SUMEM per la instal·lació de punts de càrrega en l'aparcament de l'Edifici Centre. A més, es té previst instal·lar la pèrgola als jardins de la Nimfa (pendent de finançament). Resta pendent d'estudi l'actualització dels punts existents a Fontanills, Bell Resguard i Almeria	01/2025	05/2027	09/2024		41%	40%		<input type="checkbox"/>
066	Revisar i actualitzar la regulació municipal de les instal·lacions d'energia solar.	L'acció no s'ha iniciat; amb tot, es compta amb la referència reguladora de la normativa estatal i autonòmica. Es preveu dur-la a terme més endavant.	01/2025	12/2025			100%	0%		<input type="checkbox"/>

Estat d'execució per regidories a 31/12/2025
4020 Mobilitat i via pública

Accions	Nombre	%
Planificades:	15	
Cancel·lades:	1	6,67%
Programades i no cancel·lades	13	86,67%
Iniciades:	12	92,31%
Programades i no iniciades a 31/12/2025	1	7,69%
Avançades a l'inici programat	2	13,33%
Completades a 31/12/2025	3	23,08%




Estat d'execució a 31/12/2025

Previst	Real	Situació
66,47% 	60,47% 	


13310 Estacionament regulat de vehicles

Accions	Nombre	%
Planificades:	1	
Cancel·lades:	0	6,67%
Programades i no cancel·lades	1	86,67%
Iniciades:	1	92,31%
Programades i no iniciades a 31/12/2025	0	7,69%
Avançades a l'inici programat	0	13,33%
Completades a 31/12/2025	1	23,08%

Estat d'execució a 31/12/2025

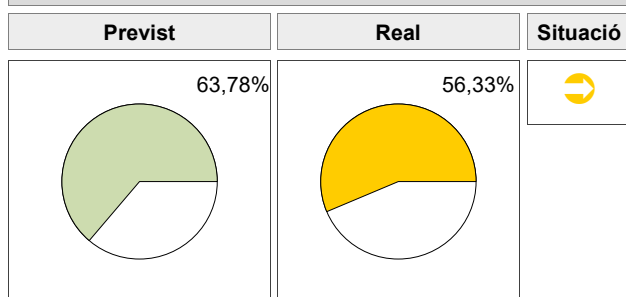
Previst	Real	Situació
100,00% 	100,00% 	








ODS vinculats:


Núm	Acció	Comentari	Prev. actualitzada		Execució		Estat d'execució			
			Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
096	Fer una anàlisi exhaustiva dels resultats de la prova pilot de la àrea verda d'estacionament.	Al juliol de 2025 SUMEM va presentar el balanç econòmic i l'anàlisi del resultat d'aquesta acció. L'acció es considera completada.	09/2023	11/2023	09/2023	11/2023	100%	100%		<input type="checkbox"/>

4020 Mobilitat i via pública
13400 Mobilitat urbana

Accions	Nombre	%
Planificades:	9	
Cancel·lades:	0	6,67%
Programades i no cancel·lades	8	86,67%
Iniciades:	7	92,31%
Programades i no iniciades a 31/12/2025	1	7,69%
Avançades a l'inici programat	1	13,33%
Completades a 31/12/2025	1	23,08%

Estat d'execució a 31/12/2025

ODS vinculats:


Núm	Acció	Comentari	Prev. actualitzada		Execució		Estat d'execució			Canc.
			Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	
024	Limitar al veïnat l'accés en cotxe entre el carrer de Capità Mirambell i el de Joan Maragall, per pacificar el trànsit al Cul d'Ocata.	L'acció es desenvolupa d'acord amb la previsió. El 12 de desembre de 2024 es va adjudicar el contracte per la redacció del projecte d'urbanització de la plaça de la Vila de Madrid i del carrer del capità Mirambell que ajudarà a assolir l'objectiu de pacificació del trànsit en el sector. El 23 de desembre de 2025 es va aprovar l'inici de l'expedient de contractació administrativa LIC 37/2025, de les obres de reurbanització de la plaça Vila de Madrid i del carrer Capità Mirambell.	01/2024	04/2027	01/2024		62%	62%		<input type="checkbox"/>
089	Millorar els espais pacificats al voltant de les escoles així com la senyalització dels camins escolars amb una protecció específica, que incentivi els trajectes a peu o en bicicleta.	En el marc de la Comissió de Via Pública s'ha estudiat l'ampliació de la vorera del c. Califòrnia que forma part del camí escolar de l'escola Bergantí. S'han realitzat també altres intervencions en el mateix sentit a l'entorn d'altres centres.	06/2025	09/2025	06/2025		100%	80%		<input type="checkbox"/>
092	Estudiar la creació de carrils bici segregats allà on sigui possible i millorar la senyalització de la xarxa de vies compartides.	Durant l'any 2025 s'ha treballat en el marc del Pla de Mobilitat Urbana que es troba en la fase de propostes.	03/2025	03/2026	03/2025		77%	50%		<input type="checkbox"/>
095	Impulsar nous itineraris a peu o en bicicleta que connectin amb Alella i Teià.	La Diputació de Barcelona ha lliurat el projecte relatiu al carril bici entre Alella i El Masnou. No s'han realitzat més actuacions.	01/2025	12/2026	01/2025		52%	50%		<input type="checkbox"/>
100	Actualitzar i reprendre les subvencions per a la compra de bicicletes elèctriques.	L'acció és pendent d'inici.	09/2025	06/2027			18%	0%		<input type="checkbox"/>
104	Treballar amb la Generalitat per fer realitat els dos nous accessos a la C-32.	Durant 2025 s'ha continuat fent un seguiment exhaustiu dels estudis en relació al projecte de la Generalitat de millora de la connectivitat i nous enllaços de la C-32. Actualment, els projectes es troben en tramitació.	06/2024	12/2025	06/2024		100%	75%		<input type="checkbox"/>
105	Estudiar mecanismes per a disposar d'espai d'aparcament al port del Masnou.	L'inici de l'acció era previst per gener de 2026. Amb tot, durant 2025 s'ha tramitat un conveni amb l'empresa concessionària del Port per tal de facilitar l'ús de l'aparcament per part dels veïns i veïnes del Masnou.	01/2026	06/2027	09/2025		0%	25%		<input type="checkbox"/>



4020

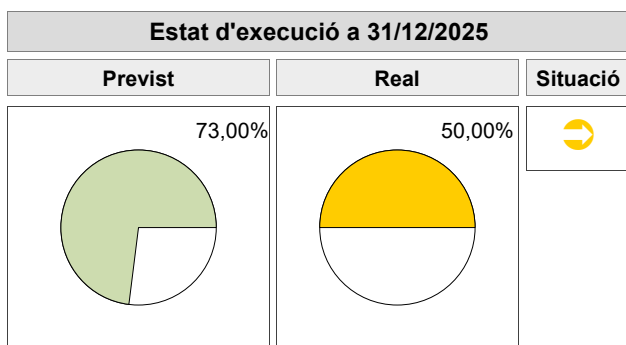
Mobilitat i via pública

Núm	Acció	Comentari	Prev. actualitzada		Execució		Estat d'execució			Canc.
			Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	
136	Pacificar l'entorn de l'escola Lluís Millet.	En data 16 de gener de 2023 es va rebre el projecte bàsic d'actuació en l'entorn de l'escola Lluís Millet, que contempla un pressupost de 598.416,10 €, IVA inclòs. Resta pendent l'execució de les actuacions. A banda, s'han dut a terme accions de pacificació de l'entorn de l'escola.	09/2023	03/2027	09/2023		65%	65%		<input type="checkbox"/>
189	Estudiar la necessitat de crear àrees d'estacionament per a motocicletes i regular el seu ús, durant l'època estival.	El departament de Mobilitat ha fet un estudi al respecte, en el qual es determina on es poden posar més places. Es canvia l'àmbit responsable a Mobilitat i via pública i Seguretat Ciutadana com a regidoria col·laboradora.	01/2025	12/2025	01/2025	12/2025	100%	100%		<input type="checkbox"/>

4020 Mobilitat i via pública


15320 Manteniment i conservació de les vies públiques

Accions	Nombre	%
Planificades:	1	
Cancel·lades:	0	6,67%
Programades i no cancel·lades	1	86,67%
Iniciades:	1	92,31%
Programades i no iniciades a 31/12/2025	0	7,69%
Avançades a l'inici programat	0	13,33%
Completades a 31/12/2025	0	23,08%



ODS vinculats:




Núm	Acció	Comentari	Prev. actualitzada		Execució		Estat d'execució			Canc.
			Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	
180	Continuar les millores en la urbanització del carrer Navarra.	Durant el primer semestre de 2025 s'ha executat la renovació de l'asfalt del carrer Navarra entre l'avinguda de Joan XXIII i el passeig de Roman Fabra i entre els carrers de Roger de Flor i Pintor Domènech Farré.	05/2025	03/2026	05/2025		73%	50%		<input type="checkbox"/>



4020 Mobilitat i via pública
44110 Servei d'autobús urbà.

Accions	Nombre	%
Planificades:	2	
Cancel·lades:	0	6,67%
Programades i no cancel·lades	2	86,67%
Iniciades:	2	92,31%
Programades i no iniciades a 31/12/2025	0	7,69%
Avançades a l'inici programat	0	13,33%
Completades a 31/12/2025	1	23,08%

Estat d'execució a 31/12/2025

Previst	Real	Situació
75,00%	75,00%	

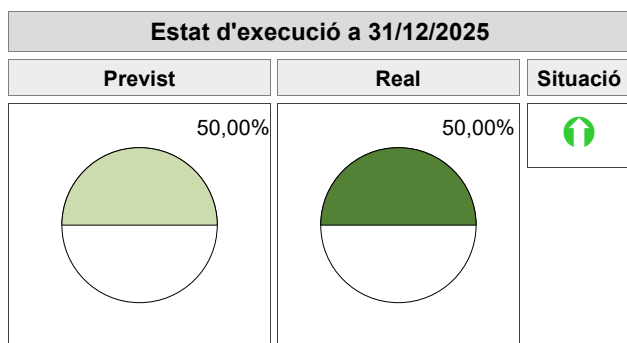
ODS vinculats:




Núm	Acció	Comentari	Prev. actualitzada		Execució		Estat d'execució			
			Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
088	Realitzar inversions tecnològiques en el transport públic per fer-lo més eficient en el recorregut.	A l'octubre del 2025 es va aprovar un nou conveni amb la Generalitat i l'Ajuntament de Teià per aferir una nova línia de transport de viatgers que dona servei als dos municipis, és la C17. Les línies C15 i C19 han modificat la seva freqüència, reduint el temps d'espera en les parades que connecten amb RENFE a 20 minuts. L'acció es considera completada.	09/2024	12/2025	09/2024	12/2025	100%	100%		<input type="checkbox"/>
103	Augmentar la freqüència de pas de l'autobús municipal en les hores puntes.	S'ha redimensionat l'horari de la C19 ajustant-lo als horaris de pas de la C15 i de la C17 perquè les parades existents en les estacions de RENFE tinguin una freqüència de pas d'autobusos de 20 minuts.	01/2025	12/2026	12/2024		50%	50%		<input type="checkbox"/>

4020 Mobilitat i via pública

44120 Altre transport de viatgers.

Accions	Nombre	%
Planificades:	2	
Cancel·lades:	1	6,67%
Programades i no cancel·lades	1	86,67%
Iniciades:	1	92,31%
Programades i no iniciades a 31/12/2025	0	7,69%
Avançades a l'inici programat	1	13,33%
Completades a 31/12/2025	0	23,08%






Núm	Acció	Comentari	Prev. actualitzada		Execució		Estat d'execució			
			Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
098	Desenvolupar accions per fomentar l'ús del transport públic per part dels infants i el jovent.	El 2025 s'ha fet l'estudi i la coordinació per la migració de títols propis a suport contactless i deixar sense efecte el suport magnètic.	01/2024	12/2024	01/2024		100%	75%		<input type="checkbox"/>
102	Impulsar en el transport de bus nocturn la parada a demanda, i així poder baixar dintre del recorregut el més a prop de casa.	El novembre de 2024 es va fer consulta al cap de la secció de viatgers del S.T. de Barcelona. L'Àrea Metropolitana té un pilot de demanda en serveis nocturn, però amb parades senyalitzades. Fora de les línies interurbanas no s'ha desenvolupat. Es planteja cursar la petició però indicant els punts de parada. Amb tot, es cancel·la l'acció ja que no es considera viable en el seu plantejament original.	01/2025	12/2025	01/2025		0%	25%		<input checked="" type="checkbox"/>

Estat d'execució per regidories a 31/12/2025

4030 Urbanisme i obres

Accions	Nombre	%
Planificades:	43	
Cancel·lades:	2	4,65%
Programades i no cancel·lades	31	72,09%
Iniciades:	25	80,65%
Programades i no iniciades a 31/12/2025	6	19,35%
Avançades a l'inici programat	1	2,33%
Completades a 31/12/2025	3	9,68%

Estat d'execució a 31/12/2025

Previst	Real	Situació
<p>58,02%</p> 	<p>24,35%</p> 	

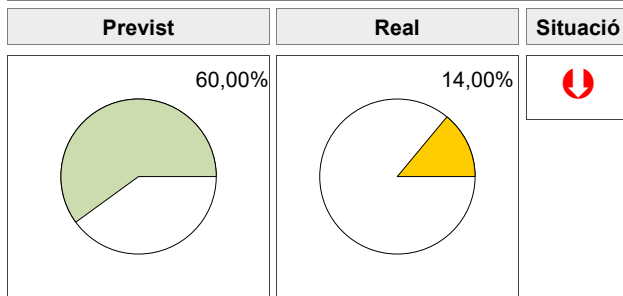


4030 Urbanisme i obres

13400 Mobilitat urbana

Accions	Nombre	%
Planificades:	5	
Cancel·lades:	0	4,65%
Programades i no cancel·lades	3	72,09%
Iniciades:	3	80,65%
Programades i no iniciades a 31/12/2025	0	19,35%
Avançades a l'inici programat	0	2,33%
Completades a 31/12/2025	0	9,68%

Estat d'execució a 31/12/2025



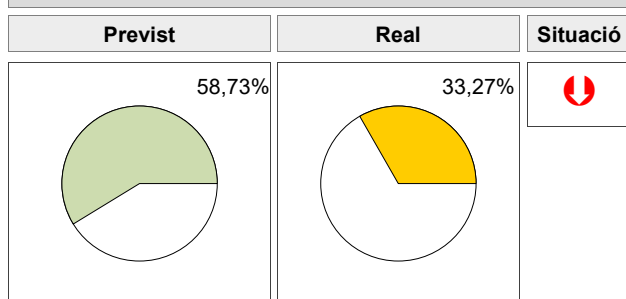
ODS vinculats:













Núm	Acció	Comentari	Prev. actualitzada		Execució		Estat d'execució				Canc.
			Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació		
023	Crear un nou espai per a vianants a un tram del carrer de Pere Grau.	Durant 2024, s'ha elaborat el projecte de reurbanització del carrer, entre el carrer dels Capitans Comellas i el del Pintor Miquel Villà. Aquest projecte va ser aprovat inicialment per acord de la junta de govern local de 13 de març de 2025. El contracte de les obres ha estat adjudicat i es preveu que s'iniciïn en 2026.	01/2025	12/2025	01/2025		100%	50%		<input type="checkbox"/>	
087	Desenvolupar el projecte d'urbanització en plataforma única al carrer de Girona.	S'ha elaborat un projecte, que és pendent de revisió i aprovació.	01/2025	12/2025	01/2025		100%	10%		<input type="checkbox"/>	
090	Crear aparcaments segurs per a bicicletes prop de les dues estacions de tren i a la plaça Nova de les Dones del Tèxtil.	L'inici de l'acció és previst per maig de 2026.	05/2026	04/2027			0%	0%		<input type="checkbox"/>	
091	Desenvolupar el carril bici al costat del municipi a l'N-II de forma segura i accessible en tot el tram del Masnou que connecti amb els municipis veïns de Premià de Mar i Montgat.	La Generalitat ha anunciat que l'inici de les obres es retarden a l'any 2027.	01/2027	06/2027			0%	0%		<input type="checkbox"/>	
176	Convertir el darrer tram del carrer de Torrent Umbert en un carrer accessible per vianants.	En data 10 d'octubre de 2024, la Junta de govern local va aprovar definitivament, una vegada resoltes les al·legacions presentades, el projecte de pacificació del Torrent Umbert, entre els carrers de Mossèn Jacint Verdaguer i Rafael de Casanova. A la data de seguiment, la licitació encara és en preparació.	03/2024	10/2024	03/2024		100%	10%		<input type="checkbox"/>	

4030 Urbanisme i obres
15100 Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanística

Accions	Nombre	%
Planificades:	11	
Cancel·lades:	1	4,65%
Programades i no cancel·lades	8	72,09%
Iniciades:	6	80,65%
Programades i no iniciades a 31/12/2025	2	19,35%
Avançades a l'inici programat	1	2,33%
Completades a 31/12/2025	1	9,68%

Estat d'execució a 31/12/2025

ODS vinculats:


Núm	Acció	Comentari	Prev. actualitzada		Execució		Estat d'execució			Canc.
			Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	
006	Tramitar i desenvolupar el planejament urbanístic de l'Estampadora.	S'ha encarregat la redacció de la modificació del PGOU.	01/2024	06/2027	01/2024		57%	40%		<input type="checkbox"/>
059	Consolidar equipaments esportius per a ús comunitari al barri de La Colomina.	L'inici de l'acció és previst per gener de 2026.	01/2026	06/2027			0%	0%		<input type="checkbox"/>
097	Desenvolupar un pla urbanístic de la façana marítima.	El pla especial es va aprovar provisionalment per l'Ajuntament; la CTU de l'Arc Metropolità ha suspès l'aprovació definitiva pendent del compliment de prescripcions. Tenint això en compte, es proposa la cancel·lació de l'acció.	01/2024	06/2027	01/2024		0%	50%		<input checked="" type="checkbox"/>
106	Millorar la integració del barri de La Colomina amb Santa Madrona, amb el centre de la Vila i amb el municipi de Teià.	Actualment la línia de bus C15 té parada a l'avinguda Kennedy i dona servei al barri de la Colomina. L'acció es considera completada.	01/2024	12/2025	01/2024	12/2025	100%	100%		<input type="checkbox"/>
143	Aconseguir nous espais per equipaments educatius, que es desprenen de la modificació urbanística al sector del Bellresguard.	L'inici de l'acció és previst per gener de 2026. L'acció es troba vinculada al desenvolupament de Can Barnades. La finca qualificada de sistema d'equipaments és propietat de l'Ajuntament. S'està pendent de la definició del seu ús.	01/2026	06/2027			0%	0%		<input type="checkbox"/>
145	Desenvolupar industrialment el Camí del Mig.	El desenvolupament de l'acció és pendent de la signatura d'un conveni entre els propietaris per liquidar la Junta de Compensació.	01/2024	12/2026	01/2024		67%	15%		<input type="checkbox"/>
146	Crear un cens de solars sense edificar i veure quins poden ser per a sòl terciari i sòl industrial.	L'acció és pendent d'iniciar-se.	01/2025	12/2025			100%	0%		<input type="checkbox"/>
178	Urbanitzar el sector de Can Montals.	S'estan executant les obres del PAU Can Montals Sud. Les corresponents de Can Montals Nord són pendents de la generació de crèdit.	09/2023	12/2024	09/2023		100%	50%		<input type="checkbox"/>
185	Reprendre les converses amb l'entitat del Casino a fi d'arribar al màxim d'acords possibles.	Durant l'any 2025 han continuat les converses amb representants de l'entitat per tal d'avançar cap un acord.	09/2023	06/2027	09/2023		61%	61%		<input type="checkbox"/>
188	Fer de la nova plaça de la Vila un espai comunitari, amb comerç local, per finalitzar l'eix que va des del parc de Vallmora fins al mar.	L'inici de l'acció és pendent de l'evolució del procés relatiu al pati del Casino.	01/2025	05/2025			100%	0%		<input type="checkbox"/>



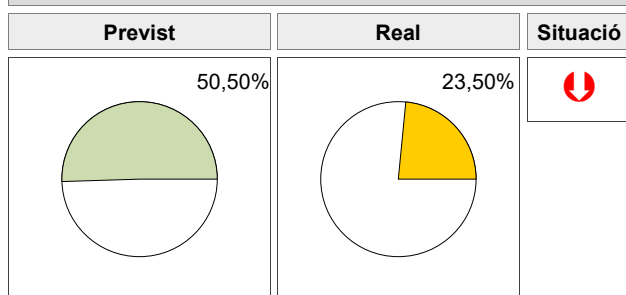
4030




Urbanisme i obres

Núm	Acció	Comentari	Prev. actualitzada		Execució		Estat d'execució			Canc.
			Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	
198	Simplificar els tràmits per obtenir llicències urbanístiques.	Durant 2025 s'ha treballat una simplificació del procés, però es considera que encara es pot millorar (autoliquidació). S'està treballant en una guia perquè els ciutadans presentin correctament les comunicacions prèvies. S'ha de redactar i aprovar un pla d'inspeccions.	09/2023	06/2027	09/2023		61%	50%		<input type="checkbox"/>

4030 Urbanisme i obres
15200 Habitatge

Accions	Nombre	%
Planificades:	6	
Cancel·lades:	0	4,65%
Programades i no cancel·lades	5	72,09%
Iniciades:	4	80,65%
Programades i no iniciades a 31/12/2025	1	19,35%
Avançades a l'inici programat	0	2,33%
Completades a 31/12/2025	0	9,68%

Estat d'execució a 31/12/2025

ODS vinculats:


Núm	Acció	Comentari	Prev. actualitzada		Execució		Estat d'execució			
			Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
001	Iniciar la nova promoció d'habitatge dotacional en règim de lloguer a la zona de Pau Casals.	El conveni amb l'Incasòl s'ha signat el 18/03/2025. Les properes passes a realitzar són l'adequació de les finques a la regulació del planejament i la redacció i aprovació d'un projecte de reparcel·lació. S'està pendent de les actuacions de l'Incasòl.	11/2023	11/2026	11/2023		70%	15%		<input type="checkbox"/>
002	Iniciar la nova promoció d'habitatge dotacional a la zona del carrer de Montevideo.	L'inici de l'acció és programat per al mes de gener de 2026.	01/2026	11/2026			0%	0%		<input type="checkbox"/>
003	Iniciar la nova promoció d'habitatge de protecció oficial en règim de lloguer a la zona del carrer d'Almeria.	El Ple municipal del mes de desembre de 2024 va aprovar inicialment el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament, l'Incasòl i l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per al desenvolupament d'aquesta promoció d'habitatge públic. El conveni ha estat aprovat ja per l'Incasòl i es va signar el març de 2025. El 25 d'abril de 2024 es va adjudicar el contracte menor del servei de redacció de l'estudi i encaix volumètric de la modificació puntual del Pla General del carrer Sevilla, a la societat Colectivo CCRS, SCP. El projecte de parcel·lació ja s'ha executat des dels Serveis Tècnics municipals, i resten pendents gestions amb el cadastre i el registre de la propietat per a la seva inscripció. El 20 de febrer de 2025 es va adjudicar el contracte menor per a la redacció del Pla Especial. El Pla es va lliurar el 20 de juny de 2025 i es va aprovar inicialment per decret d'alcaldia de data 23 de juny de 2025. A 31 de desembre de 2025 el Pla Especial ja era aprovat definitivament i es resta a l'espera de les actuacions de l'Incasòl.	11/2023	11/2026	11/2023		70%	50%		<input type="checkbox"/>



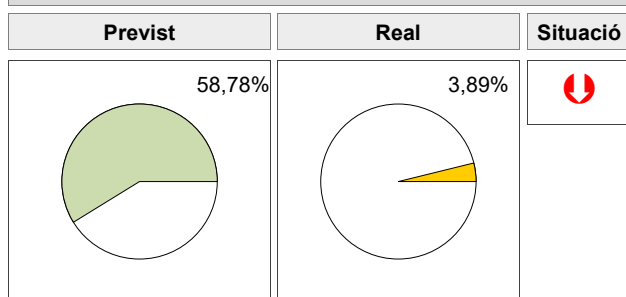
4030










Urbanisme i obres

Núm	Acció	Comentari	Prev. actualitzada		Execució		Estat d'execució			
			Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
004	Començar una nova promoció d'habitatge de protecció oficial a Can Barnades.	Els projectes de reparcel·lació i d'urbanització van ser aprovats definitivament per acord de la junta de govern local de 5 de juny de 2025. A la data d'avaluació les obres s'estan executant. A finals del mes de març de 2026 acaba el termini per la presentació d'ofertes per l'adjudicació del dret de superfície de la finca de propietat municipal.	06/2024	03/2027	06/2024		56%	56%		<input type="checkbox"/>
005	Començar una nova promoció d'habitatge de protecció oficial a La Colomina Nord.	Les obres d'urbanització han estat acabades. Actualment s'estan mantenint converses amb els copropietaris de la finca per poder promoure la construcció dels habitatges.	01/2024	12/2026	01/2024		67%	20%		<input type="checkbox"/>
012	Posar en marxa un pla de promoció de la instal·lació d'ascensors en edificis sense accessibilitat.	L'acció no s'ha iniciat.	09/2025	06/2026			40%	0%		<input type="checkbox"/>

4030 Urbanisme i obres
15320 Manteniment i conservació de les vies públiques

Accions	Nombre	%
Planificades:	9	
Cancel·lades:	1	4,65%
Programades i no cancel·lades	6	72,09%
Iniciades:	4	80,65%
Programades i no iniciades a 31/12/2025	2	19,35%
Avançades a l'inici programat	0	2,33%
Completades a 31/12/2025	0	9,68%

Estat d'execució a 31/12/2025

ODS vinculats:



Núm	Acció	Comentari	Prev. actualitzada		Execució		Estat d'execució			Canc.
			Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	
094	Millorar l'accés a peu o en bicicleta entre Voramar I i Voramar II, amb una trama urbana, segura i accessible.	La Generalitat ha anunciat el retard de l'inici de les obres de pacificació a l'any 2027.	01/2027	06/2027			0%	0%		<input type="checkbox"/>
110	Desenvolupar la plaça de les Lletres davant de la Biblioteca.	S'ha elaborat un avantprojecte.	06/2025	05/2027	06/2025		29%	5%		<input type="checkbox"/>
177	Millorar la baixada del carrer de Gaudí.	S'hi han realitzat intervencions en algun tram.	01/2025	05/2025	01/2025		100%	10%		<input type="checkbox"/>
181	Eliminar progressivament les barreres arquitectòniques al voltant de la plaça de Ramón y Cajal i del carrer de Pau Casals.	L'acció no s'ha iniciat. Es proposa la cancel·lació.	03/2025	06/2025			0%	0%		<input checked="" type="checkbox"/>
186	Fer realitat la conversió de la carretera N-II en un passeig.	La Generalitat ha informat que les obres començaran l'any 2027.	01/2027	06/2027			0%	0%		<input type="checkbox"/>
187	Pacificar el carrer de Tomàs Vives, que deixarà de ser una sortida a l'N-II per esdevenir part de la plaça de la Vila.	L'inici de l'acció és pendent de l'evolució del procés relatiu al pati del Casino.	01/2025	12/2025			100%	0%		<input type="checkbox"/>
190	Millorar la plaça de la Reina Maria Cristina.	La CTU de l'Arc Metropolità ha aprovat la MPGOU del c. Sant Jordi, que condiciona l'inici de les actuacions.	01/2025	12/2025	01/2025		100%	5%		<input type="checkbox"/>
191	Reordenar i introduir millores en l'espai públic del carrer d'Almeria.	L'inici de l'acció és pendent.	01/2025	12/2025			100%	0%		<input type="checkbox"/>
192	Reurbanitzar el carrer de La Segarra.	S'ha fet el projecte. Resta pendent la programació de les obres.	01/2025	12/2025	01/2025		100%	15%		<input type="checkbox"/>

4030 Urbanisme i obres

16400 Cementiri


Accions	Nombre	%
Planificades:	1	
Cancel·lades:	0	4,65%
Programades i no cancel·lades	1	72,09%
Iniciades:	1	80,65%
Programades i no iniciades a 31/12/2025	0	19,35%
Avançades a l'inici programat	0	2,33%
Completades a 31/12/2025	0	9,68%

Estat d'execució a 31/12/2025

Previst	Real	Situació
40,00%	40,00%	

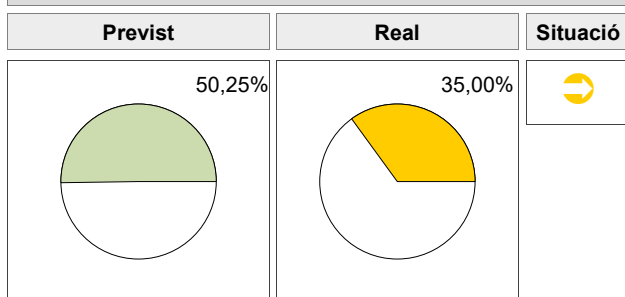
ODS vinculats:







Núm	Acció	Comentari	Prev. actualitzada		Execució		Estat d'execució			
			Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
196	Continuar el pla de millores del cementiri.	L'estiu de 2025 es va aprovar definitivament l'establiment del servei de sales de vetlles i de cerimònies, que comporta la realització d'unes inversions valorades en 240.828,46 €. Per altra part, en mesos anteriors s'han fet inversions: adquisició d'un portafèretres (12/2023) i rehabilitació de façanes i cobertes (05-09/2024). Per 2026 es preveu continuar les actuacions de millora.	09/2025	06/2026	11/2024		40%	40%		<input type="checkbox"/>

4030 Urbanisme i obres
17100 Parcs, jardins i zones verdes.

Accions	Nombre	%
Planificades:	4	
Cancel·lades:	0	4,65%
Programades i no cancel·lades	3	72,09%
Iniciades:	3	80,65%
Programades i no iniciades a 31/12/2025	0	19,35%
Avançades a l'inici programat	0	2,33%
Completades a 31/12/2025	1	9,68%

Estat d'execució a 31/12/2025

ODS vinculats:





Núm	Acció	Comentari	Prev. actualitzada		Execució		Estat d'execució				Canc.
			Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació		
058	Instal·lar un pumtrack al parc de Vallmora, circuit de dimensions reduïdes que es pot recórrer amb bicicleta o monopati.	El 30/12/2024 es va aprovar el contracte per la redacció de l'avantprojecte d'urbanització del parc Vallmora per la implantació del pump track.	06/2025	09/2026	12/2024		44%	25%		<input type="checkbox"/>	
074	Ampliar el parc del Mirador.	L'acció és vinculada a la urbanització de Can Barnades. Es preveu que les obres s'iniciïn en 2026.	09/2025	03/2026	09/2025		57%	15%		<input type="checkbox"/>	
085	Fer el Parc Caramar accessible i atractiu per al veïnat, amb especial atenció a les activitats dinamitzades per la infància, aprofitant la localització del trenet.	Acció completada. El contracte de l'obra va ser adjudicat per acord de la Junta de govern local de 27 de juliol de 2023. L'acta de replanteig es va signar l'11 de maig de 2023, amb un termini d'execució de 3 mesos, que es va prorrogar fins finals d'octubre de 2023. L'obra va acabar i es va recepcionar el 27 d'octubre de 2023.	09/2023	11/2023	09/2023	11/2023	100%	100%		<input type="checkbox"/>	
182	Reordenar l'espai de la zona de rials i l'espai actual del correccan de l'espai verd ubicat al final del carrer de la Goleta Constança.	L'inici de l'acció és previst per gener de 2027., tot i que s'han iniciat actuacions de millora.	01/2027	05/2027			0%	0%		<input type="checkbox"/>	

4030 Urbanisme i obres

23125 Joventut.


Accions	Nombre	%
Planificades:	1	
Cancel·lades:	0	4,65%
Programades i no cancel·lades	0	72,09%
Iniciades:	0	80,65%
Programades i no iniciades a 31/12/2025	0	19,35%
Avançades a l'inici programat	0	2,33%
Completades a 31/12/2025	0	9,68%

Estat d'execució a 31/12/2025

Previst	Real	Situació
0,00%	0,00%	
		

ODS vinculats:






Núm	Acció	Comentari	Prev. actualitzada		Execució		Estat d'execució			
			Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
054	Fer millores a l'skatepark.	L'inici de l'acció és previst per gener de 2026.	01/2026	12/2026			0%	0%		<input type="checkbox"/>

4030 Urbanisme i obres

31113 Benestar animal i control d'animals de companyia


Accions	Nombre	%
Planificades:	1	
Cancel·lades:	0	4,65%
Programades i no cancel·lades	0	72,09%
Iniciades:	0	80,65%
Programades i no iniciades a 31/12/2025	0	19,35%
Avançades a l'inici programat	0	2,33%
Completades a 31/12/2025	0	9,68%

Estat d'execució a 31/12/2025

Previst	Real	Situació
0,00%	0,00%	
		

ODS vinculats:






Núm	Acció	Comentari	Prev. actualitzada		Execució		Estat d'execució			
			Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
166	Crear un circuit d'agilitat per a gossos al Parc Vallmora.	L'inici de l'acció és previst per gener de 2026.	01/2026	12/2026			0%	0%		<input type="checkbox"/>


Estat d'execució per regidories a 31/12/2025
4030 Urbanisme i obres
32300 Funcionament de centres docents d'ensenyament infantil i primari i educació especial

Accions	Nombre	%
Planificades:	1	
Cancel·lades:	0	4,65%
Programades i no cancel·lades	1	72,09%
Iniciades:	1	80,65%
Programades i no iniciades a 31/12/2025	0	19,35%
Avançades a l'inici programat	0	2,33%
Completades a 31/12/2025	1	9,68%

Estat d'execució a 31/12/2025

Previst	Real	Situació
100,00%	100,00%	
		

ODS vinculats:

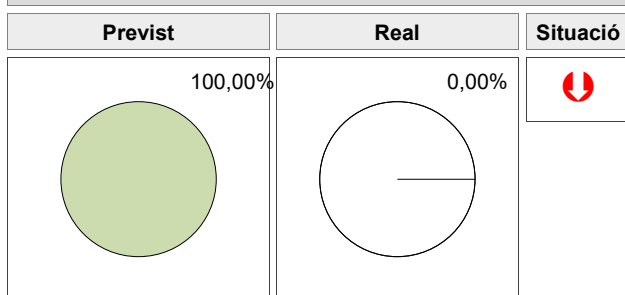

Núm	Acció	Comentari	Prev. actualitzada		Execució		Estat d'execució			
			Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
134	Millorar el pati de l'Escola Ocata i abordar la seva accessibilitat.	Les obres de millora del pati de l'Escola Ocata, adjudicades el 12 de juliol de 2024 i iniciades el 7 d'agost del mateix any, s'han completat segons amb allò previst.	01/2024	12/2024	01/2024	12/2024	100%	100%		<input type="checkbox"/>

4030 Urbanisme i obres

32700 Foment del civisme i equipaments cívics municipals.


Accions	Nombre	%
Planificades:	1	
Cancel·lades:	0	4,65%
Programades i no cancel·lades	1	72,09%
Iniciades:	0	80,65%
Programades i no iniciades a 31/12/2025	1	19,35%
Avançades a l'inici programat	0	2,33%
Completades a 31/12/2025	0	9,68%

Estat d'execució a 31/12/2025



ODS vinculats:



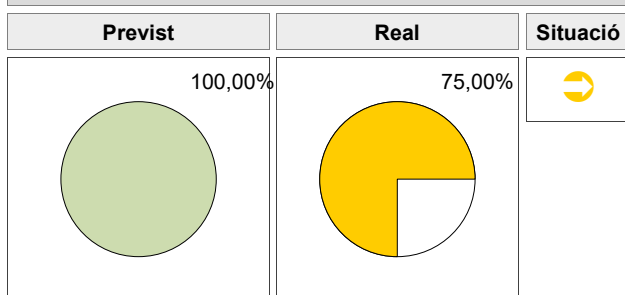
Núm	Acció	Comentari	Prev. actualitzada		Execució		Estat d'execució			
			Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
195	Cercar opcions de nous espais per a continuar dotant el barri d'Ocata de més equipaments cívics.	L'inici de l'acció resta pendent.	01/2025	12/2025			100%	0%		<input type="checkbox"/>

4030 Urbanisme i obres

33300 Equipaments culturals.


Accions	Nombre	%
Planificades:	1	
Cancel·lades:	0	4,65%
Programades i no cancel·lades	1	72,09%
Iniciades:	1	80,65%
Programades i no iniciades a 31/12/2025	0	19,35%
Avançades a l'inici programat	0	2,33%
Completades a 31/12/2025	0	9,68%

Estat d'execució a 31/12/2025



ODS vinculats:



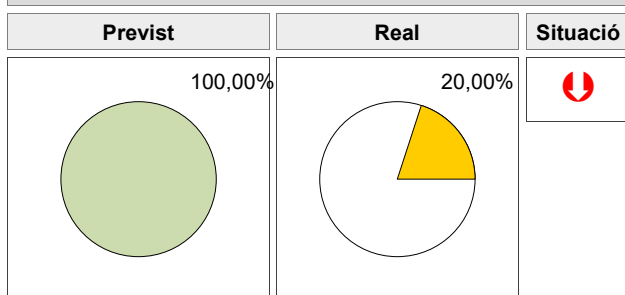
Núm	Acció	Comentari	Prev. actualitzada		Execució		Estat d'execució			
			Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
129	Fer un projecte de rehabilitació de l'espai de l'antic cinema del «Casinet», vinculat a les entitats i a la ciutadania, amb uns usos que seran definits a través d'un procés participatiu.	S'ha fet el projecte. S'esta treballant en els projectes de substitució de la coberta i d'arranjament de la façana.	02/2025	05/2025	02/2025		100%	75%		<input type="checkbox"/>

4030 Urbanisme i obres

33611 Protecció i gestió del patrimoni històric i artístic. Museu municipal.


Accions	Nombre	%
Planificades:	1	
Cancel·lades:	0	4,65%
Programades i no cancel·lades	1	72,09%
Iniciades:	1	80,65%
Programades i no iniciades a 31/12/2025	0	19,35%
Avançades a l'inici programat	0	2,33%
Completades a 31/12/2025	0	9,68%

Estat d'execució a 31/12/2025



ODS vinculats:






Núm	Acció	Comentari	Prev. actualitzada		Execució		Estat d'execució			
			Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
127	Elaborar un Pla Especial de protecció de les Mines d'aigua.	Es troba en curs de redacció la normativa del Pla Especial, a partir de la documentació de l'estudi previ.	01/2024	12/2024	01/2024		100%	20%		<input type="checkbox"/>


4030 Urbanisme i obres
43120 Mercats

Accions	Nombre	%
Planificades:	1	
Cancel·lades:	0	4,65%
Programades i no cancel·lades	1	72,09%
Iniciades:	1	80,65%
Programades i no iniciades a 31/12/2025	0	19,35%
Avançades a l'inici programat	0	2,33%
Completades a 31/12/2025	0	9,68%

Estat d'execució a 31/12/2025

Previst	Real	Situació
76,00%	60,00%	
		




ODS vinculats:


Núm	Acció	Comentari	Prev. actualitzada		Execució		Estat d'execució			
			Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
153	Portar a terme el Pla de millora del Mercat Municipal que permeti una nova configuració de l'equipament, amb major visibilitat i integració amb l'entorn.	Durant l'any 2025 s'ha treballant el projecte de millora de la infraestructura. Es té previst millorar el paviment i el sostre del mercat i canviar les cambres frigorífiques.	06/2024	06/2026	06/2024		76%	60%		<input type="checkbox"/>

Estat d'execució per regidories a 31/12/2025
4041 Serveis urbans i manteniment

Accions	Nombre	%
Planificades:	18	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	15	83,33%
Iniciades:	11	73,33%
Programades i no iniciades a 31/12/2025	4	26,67%
Avançades a l'inici programat	2	11,11%
Completades a 31/12/2025	1	6,67%




Estat d'execució a 31/12/2025

Previst	Real	Situació
51,17% 	32,06% 	


13400 Mobilitat urbana

Accions	Nombre	%
Planificades:	1	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	0	83,33%
Iniciades:	0	73,33%
Programades i no iniciades a 31/12/2025	0	26,67%
Avançades a l'inici programat	1	11,11%
Completades a 31/12/2025	0	6,67%

Estat d'execució a 31/12/2025

Previst	Real	Situació
0,00% 	5,00% 	

ODS vinculats:

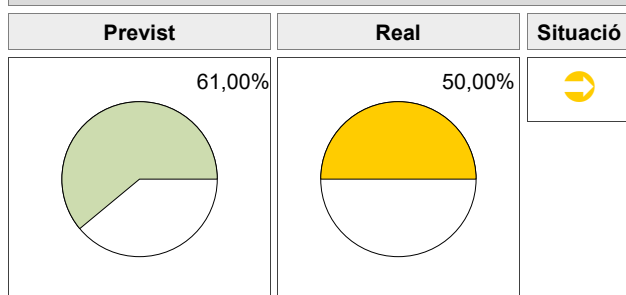

Núm	Acció	Comentari	Prev. actualitzada		Execució		Estat d'execució			Canc.
			Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	
179	Crear un itinerari segur, quant il·luminació i voreres accessibles, des de les estacions de tren del Masnou i Ocata fins al barri del Masnou Alt.	Actualment el PMUS es troba en la fase de propostes. S'estan executant les obres del passeig de Roman Fabra.	01/2026	06/2027			0%	5%		<input type="checkbox"/>

4041 Serveis urbans i manteniment

15300 Manteniment i serveis.


Accions	Nombre	%
Planificades:	1	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	1	83,33%
Iniciades:	1	73,33%
Programades i no iniciades a 31/12/2025	0	26,67%
Avançades a l'inici programat	0	11,11%
Completades a 31/12/2025	0	6,67%

Estat d'execució a 31/12/2025



ODS vinculats:



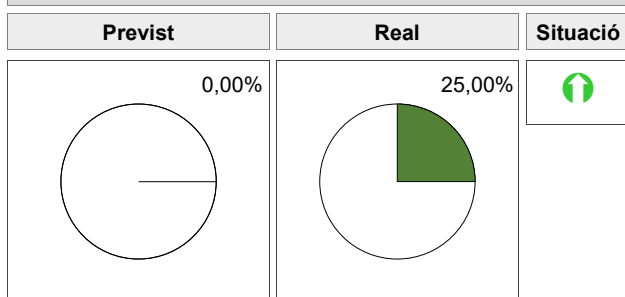
Núm	Acció	Comentari	Prev. actualitzada		Execució		Estat d'execució			
			Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
168	Potenciar la figura dels agents cívics i incrementar-ne el seu nombre.	Donat que amb l'organigrama vigent els agents cívics depenen de l'àmbit de Territori i de la regidoria de Serveis urbans i manteniment, es modifiquen les responsabilitats de l'actuació i el programa de referència en aquest sentit. Durant l'any 2025 no s'ha incrementat el nombre d'agents, per la qual cosa es considera que l'acció no està executada d'acord amb les previsions temporals.	09/2023	06/2027	09/2023		61%	50%		<input type="checkbox"/>

4041 Serveis urbans i manteniment

15320 Manteniment i conservació de les vies públiques


Accions	Nombre	%
Planificades:	1	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	0	83,33%
Iniciades:	0	73,33%
Programades i no iniciades a 31/12/2025	0	26,67%
Avançades a l'inici programat	1	11,11%
Completades a 31/12/2025	0	6,67%

Estat d'execució a 31/12/2025



ODS vinculats:




Núm	Acció	Comentari	Prev. actualitzada		Execució		Estat d'execució			Canc.
			Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	
065	Instal·lar mobiliari urbà fet amb els plàstics que es fan de les recollides selectives.	Tot i que l'inici de l'acció és previst per al mes de setembre de 2026, durant el primer semestre de l'any 2025 s'han adquirit ja papereres fetes amb plàstic reciclat. Durant el segon semestre també es van adquirir 8 jardineres i fonts fetes amb plàstic reciclat.	09/2026	06/2027	01/2025		0%	25%		<input type="checkbox"/>




4041 Serveis urbans i manteniment
16500 Enllumenat públic.

Accions	Nombre	%
Planificades:	3	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	2	83,33%
Iniciades:	2	73,33%
Programades i no iniciades a 31/12/2025	0	26,67%
Avançades a l'inici programat	0	11,11%
Completades a 31/12/2025	0	6,67%

Estat d'execució a 31/12/2025

Previst	Real	Situació
46,67%	26,67%	

ODS vinculats:

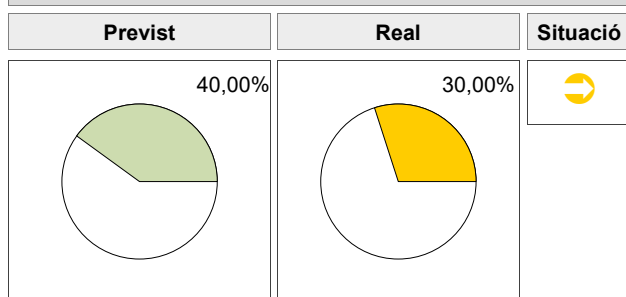

Núm	Acció	Comentari	Prev. actualitzada		Execució		Estat d'execució			
			Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
078	Regular el flux lumínic i el funcionament dels fanals, adaptant-lo a les necessitats de cada zona.	L'execució de l'acció és pendent de la concessió de la subvenció de la Diputació. Hores d'ara el recurs ja ha estat concedit i s'està a l'espera dels inicis dels treballs de redacció del Pla Director de l'Enllumenat per part de l'empresa adjudicatària.	01/2025	06/2027	10/2024		40%	30%		<input type="checkbox"/>
079	Utilitzar progressivament energia solar per alimentar l'enllumenat públic.	L'inici de l'acció és previst per gener de 2026. Tot i això, l'equip tècnic municipal ja treballa amb l'empresa que ha fet la instal·lació de les plaques fotovoltaïques municipals per tal de posar-les en marxa.	01/2026	05/2027			0%	0%		<input type="checkbox"/>
099	Il·luminar el passeig Marítim fins a Montgat.	Al mes de març de 2025 es va emetre informe favorable del Servei de Contaminació Luminica de la Generalitat. El mes d'abril es va rebre l'oferta de condicions per a l'ocupació del DPMT, per part del Servei del Litoral de la Generalitat, que s'aprova per l'Ajuntament. El mes de juny es va rebre l'autorització per fer les obres per part del Servei del Litoral de la Generalitat, així com també l'autorització d'ADIF. El mes de juliol s'han fet els tràmits per contractar l'execució de les obres, que en el moment de l'avaluació ja s'han iniciat.	05/2024	06/2025	05/2024		100%	50%		<input type="checkbox"/>

4041 Serveis urbans i manteniment

17000 Medi ambient.


Accions	Nombre	%
Planificades:	1	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	1	83,33%
Iniciades:	1	73,33%
Programades i no iniciades a 31/12/2025	0	26,67%
Avançades a l'inici programat	0	11,11%
Completades a 31/12/2025	0	6,67%

Estat d'execució a 31/12/2025



ODS vinculats:






Núm	Acció	Comentari	Prev. actualitzada		Execució		Estat d'execució			Canc.
			Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	
060	Implantar mesures del Pla d'estalvi energètic en edificis municipals i enllumenat públic.	Durant 2025 s'ha canviat l'enllumenat a led del Mercat Municipal i es preveu substituir l'enllumenat existent en diferents carrers del municipi per llums led.	01/2025	06/2027	01/2025		40%	30%		<input type="checkbox"/>

4041 Serveis urbans i manteniment

17020 Platges.


Accions	Nombre	%
Planificades:	1	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	1	83,33%
Iniciades:	0	73,33%
Programades i no iniciades a 31/12/2025	1	26,67%
Avançades a l'inici programat	0	11,11%
Completades a 31/12/2025	0	6,67%

Estat d'execució a 31/12/2025

Previst	Real	Situació
100,00%	0,00%	
		

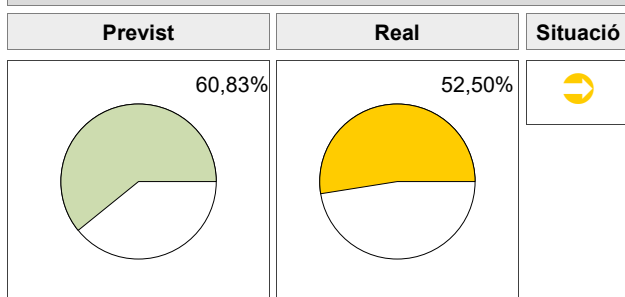
ODS vinculats:









Núm	Acció	Comentari	Prev. actualitzada		Execució		Estat d'execució			
			Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
067	Delimitar les zones de protecció i recuperació dels ecosistemes sorrencs i d'espècies naturals a les platges.	L'acció no s'ha iniciat. S'ha de sol·licitar permís a Costes.	01/2025	12/2025			100%	0%		<input type="checkbox"/>

4041 Serveis urbans i manteniment
17100 Parcs, jardins i zones verdes.

Accions	Nombre	%
Planificades:	6	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	6	83,33%
Iniciades:	5	73,33%
Programades i no iniciades a 31/12/2025	1	26,67%
Avançades a l'inici programat	0	11,11%
Completades a 31/12/2025	1	6,67%

Estat d'execució a 31/12/2025

ODS vinculats:

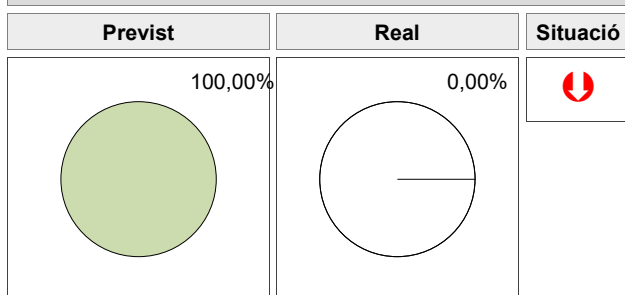

Núm	Acció	Comentari	Prev. actualitzada		Execució		Estat d'execució			Canc.
			Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	
068	Utilitzar espècies pròpies de l'ecosistema mediterrani als espais verds municipals.	Durant 2025 s'han fet plantacions amb el criteri que fixa aquesta acció.	01/2024	06/2027	01/2024		57%	57%		<input type="checkbox"/>
069	Crear façanes verdes als nous equipaments.	L'acció no s'ha iniciat en el termini previst.	01/2025	12/2026			50%	0%		<input type="checkbox"/>
070	Millorar l'arbrat viari, substituint espècies no adequades per les seves dimensions, la seva ubicació o el deteriorament de les voreres.	De forma similar a l'acció 068, l'acció es desenvolupa com un criteri que s'aplica en la gestió de l'arbrat viari. Durant l'any 2025 s'ha desenvolupat d'acord amb allò previst.	01/2024	06/2027	01/2024		57%	57%		<input type="checkbox"/>
075	Dur a terme accions, d'acord amb l'Agència Catalana de l'Aigua, per la restauració de la riera d'Alella.	Es segueix demanant les subvencions per restauració de lleres en trams urbans i enguany es torna a realitzar la restauració d'una nova zona de la riera. Per 2026, juntament amb l'ACA i el Consell comarcal, es preveu dur a terme una actuació molt més important que la que s'han fet als darrers anys de desbrossada i plantació. L'actuació de renaturalització de la riera proposada per enguany té previst l'arrencament del rizoma de la canya, una posterior estabilització del terreny i una replantació amb vegetació de riera.	09/2023	06/2027	09/2023		61%	61%		<input type="checkbox"/>
138	Crear una ruta al Parc del Llac i el seu entorn per als infants del municipi on puguin descobrir diferents elements de la zona.	Les espècies del parc ja estan senyalitzades i el circuit saludable ja està fet. L'acció es considera completada.	01/2025	12/2025	01/2025	12/2025	100%	100%		<input type="checkbox"/>
184	Completar una xarxa de parcs infantils inclusius i accessibles al nostre municipi amb una configuració més atractiva i un manteniment més curós.	En 2025 es van instal·lar jocs accessibles a dos parcs; cada any quan es renoven entre dos i tres parcs infantils i es doten amb elements inclusius. Es va avançant amb l'objectiu i actualment només hi ha quatre parcs sense elements accessibles i inclusius.	01/2025	06/2027	01/2025		40%	40%		<input type="checkbox"/>

4041 Serveis urbans i manteniment

23127 Persones amb diversitat funcional.


Accions	Nombre	%
Planificades:	1	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	1	83,33%
Iniciades:	0	73,33%
Programades i no iniciades a 31/12/2025	1	26,67%
Avançades a l'inici programat	0	11,11%
Completades a 31/12/2025	0	6,67%

Estat d'execució a 31/12/2025



ODS vinculats:




Núm	Acció	Comentari	Prev. actualitzada		Execució		Estat d'execució			
			Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
173	Fer un estudi de millora de l'accessibilitat dels principals equipaments i altres espais públics municipals, com parcs i zones verdes.	L'acció és pendent d'iniciar-se.	01/2025	12/2025			100%	0%		<input type="checkbox"/>


4041 Serveis urbans i manteniment
32300 Funcionament de centres docents d'ensenyament infantil i primari i educació especial

Accions	Nombre	%
Planificades:	1	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	1	83,33%
Iniciades:	1	73,33%
Programades i no iniciades a 31/12/2025	0	26,67%
Avançades a l'inici programat	0	11,11%
Completades a 31/12/2025	0	6,67%

Estat d'execució a 31/12/2025

Previst	Real	Situació
47,00%	47,00%	




ODS vinculats:


Núm	Acció	Comentari	Prev. actualitzada		Execució		Estat d'execució			
			Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
133	Aplicar el programa d'accions de manteniment i millora dels centres educatius públics, amb la corresponent dotació pressupostària.	L'acció es desenvolupa d'acord amb les previsions. Les actuacions realitzades en 2025 han estat: - Millora del lavabo de l'13 a l'Escola Ocata. - Insonorització de dues aules a l'Escola Ocata. - Adequació de l'antiga aula d'informàtica com a aula polivalent a l'Escola Marinada - Millora de la impermeabilització del gimnàs de l'Escola Rosa Sensat. - Renovació del paviment de dues aules d'educació infantil a l'Escola Ferrer i Guàrdia. - Arranjament de l'espai exterior de l'EB Sol Solet. - Climatització de dues aules a l'EB La Barqueta Per a l'any 2026 es tenen previstes altres actuacions, com la coberta de l'Escola Ocata, la cornisa de l'Escola Rosa Sensat i altres actuacions a definir. En el pressupost vigent s'han consignat 60.000 euros i en un propera modificació del pressupost es té previst consignar 60.000 euros més.	09/2024	06/2027	09/2024		47%	47%		<input type="checkbox"/>



4041 Serveis urbans i manteniment
92060 Gestió d'edificis municipals.

Accions	Nombre	%
Planificades:	2	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	2	83,33%
Iniciades:	1	73,33%
Programades i no iniciades a 31/12/2025	1	26,67%
Avançades a l'inici programat	0	11,11%
Completades a 31/12/2025	0	6,67%

Estat d'execució a 31/12/2025

Previst	Real	Situació
34,00%	12,50%	
		

ODS vinculats:




Núm	Acció	Comentari	Prev. actualitzada		Execució		Estat d'execució			
			Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
086	Dotar els equipaments municipals amb instal·lacions automatitzades per a la millora de la seguretat, l'eficiència energètica i l'accessibilitat.	L'acció és pendent d'iniciar-se, tot i que s'ha començat a treballar en diverses línies: - Actuacions d'estalvi d'aigua (mitjançant airejadors i aixetes automàtiques, per evitar que les aixetes quedin obertes) i d'energia a les escoles bressol. - Instal·lació d'equips de mesura elèctrica als bars dels camps de futbol d'Ocata i del Masnou per poder fer un seguiment del consum. - Reducció del cabal d'algunes aixetes que no tenen airejadors, per disminuir el consum d'aigua. Pel que fa a la dotació d'instal·lacions automatitzades als equipaments que millorin l'accessibilitat es treballa, per exemple, en la instal·lació de mecanismes d'obertura automàtica de les portes.	01/2025	06/2027	01/2025		40%	25%		<input type="checkbox"/>
126	Instal·lar focus als edificis més emblemàtics del Masnou per il·luminar en colors segons commemoracions diverses.	L'inici de l'acció resta pendent. Es preveu que s'iniciarà durant el segon trimestre de l'any 2026, amb la dotació econòmica corresponent.	06/2025	06/2027			28%	0%		<input type="checkbox"/>

Estat d'execució per regidories a 31/12/2025

4050 Habitatge

Accions	Nombre	%
Planificades:	7	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	7	100,00%
Iniciades:	7	100,00%
Programades i no iniciades a 31/12/2025	0	0,00%
Avançades a l'inici programat	0	0,00%
Completades a 31/12/2025	3	42,86%

Estat d'execució a 31/12/2025

Previst	Real	Situació
<p>59,29%</p> 	<p>73,00%</p> 	<p>↑</p>

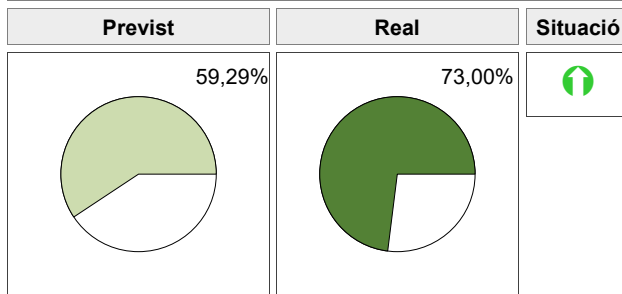


4050 Habitatge

15200 Habitatge

Accions	Nombre	%
Planificades:	7	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	7	100,00%
Iniciades:	7	100,00%
Programades i no iniciades a 31/12/2025	0	0,00%
Avançades a l'inici programat	0	0,00%
Completades a 31/12/2025	3	42,86%

Estat d'execució a 31/12/2025









ODS vinculats:



Núm	Acció	Comentari	Prev. actualitzada		Execució		Estat d'execució			
			Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
007	Promoure la borsa de lloguer social oferint incentius, ajuts i serveis de suport a la propietat que facin atractiva l'adscripció d'habitatges.	La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 16 d'octubre de 2025, va aprovar: 1. La modificació de l'article 5 de la Ordenança Fiscal Reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles, aplicable a l'exercici 2026, mitjançant la incorporació d'un nou punt 6. Aquesta modificació es fonamenta en la necessitat de mobilitzar el parc d'habitatge existent, combatre l'emergència habitacional i incentivar la incorporació d'habitatges buits al mercat de lloguer social, promovent la implicació dels propietaris privats en programes amb finalitats socials i impulsats per l'administració. 2. Nova Ordenança fiscal reguladora del recàrrec sobre l'Impost sobre Béns Immobles aplicable als immobles d'ús residencial que es troben desocupats amb caràcter permanent. Aquesta mesura s'emmarca en la necessitat de mobilitzar el parc d'habitatge existent, combatre l'emergència habitacional i incentivar la incorporació dels habitatges buits al mercat, especialment al lloguer assequible o social, en compliment de la funció social de la propietat. Per altra part, el servei assenyala que la Borsa funciona amb normalitat i es resolen els incidències quotidianes de gestió que es produeixen.	01/2024	06/2027	01/2024		57%	57%		<input type="checkbox"/>

4050 Habitatge

Núm	Acció	Comentari	Prev. actualitzada		Execució		Estat d'execució			
			Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
008	Crear un cens d'habitatges buits	<p>L'aprovació del Pla per a la mobilització dels habitatges buits i el Programa d'inspeccions al municipi del Masnou 2025-2027 per part de la Junta de Govern Local, en sessió de 19 de juny de 2025, ha permès iniciar un programa específic d'inspeccions amb l'objectiu de detectar i verificar la situació real dels habitatges buits al municipi.</p> <p>En aquest marc, a data 30 de juny de 2025, s'han inspeccionat 114 habitatges dels 591 inicialment identificats com a possibles buits.</p> <p>Els resultats obtinguts fins al moment són els següents:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Habitatges ocupats: 10 - Habitatges possiblement ocupats: 14 - Habitatges buits confirmats: 4 - Habitatges tapiats: 3 - Habitatges en obres, reformes o en procés de venda: 2 - Habitatges amb altres usos (pàrquings, locals comercials, etc.): 7 - Habitatges amb indicis de desocupació (possiblement buits): 9 - Habitatges no identificats: 68 <p>Pel que fa a la resta d'habitatges inspeccionats, la informació obtinguda ha estat inconclusa i caldrà fer-hi seguiment. D'acord amb aquests resultats preliminars, es considera necessari continuar amb les tasques d'inspecció per completar la diagnosi i garantir la fiabilitat del cens d'habitatges buits al municipi, com a pas previ per a la seva mobilització cap al lloguer o la mediació social.</p> <p>Actualment s'està realitzant una anàlisi dels padrons històrics dels possibles habitatges buits identificats segons els Indicis de Desocupació d'Habitatges (IDESH), amb l'objectiu de motivar de manera més objectiva aquells habitatges que no han registrat persones empadronades durant un període continuat de 5 anys. Queda pendent revisar i actualitzar el Pla Local d'habitatge</p>	10/2023	12/2024	10/2023		100%	100%		<input type="checkbox"/>
009	Desenvolupar un programa d'inspeccions per assegurar el compliment de la normativa municipal en matèria d'apartaments turístics i de lloguer d'habitacions.	S'han elaborat comunicacions informatives adreçades als habitatges que desenvolupaven activitat turística de manera irregular, mitjançant les quals s'informa de la detecció d'aquesta activitat per part de l'Ajuntament del Masnou i es requereix el seu cessament, advertint de la possible incoació d'expedients sancionadors en cas de persistència.	01/2025	06/2027	06/2024		40%	40%		<input type="checkbox"/>
010	Dotar l'Oficina Local d'Habitatge de més recursos per a donar més servei a la ciutadania en matèria d'habitatge i rehabilitació.	Amb l'aprovació de la plantilla i el pressupost per l'any 2026 (novembre de 2025) es va acordar el reforç de l'Oficina Local d'Habitatge amb una segona plaça de tècnic o tècnica. <p>En el moment de fer-se l'avaluació, s'està duent a terme el procés per a la cobertura d'aquesta plaça.</p> <p>L'acció es considera, per tant, completada.</p>	05/2024	06/2027	05/2024	12/2025	54%	100%		<input type="checkbox"/>
011	Desenvolupar accions per a la millora de l'eficiència energètica dels habitatges.	Aquesta acció es desenvolupa bàsicament a través de les subvencions per a la rehabilitació d'habitatges.	01/2024	06/2027	01/2024		57%	57%		<input type="checkbox"/>
013	Estudiar la participació a les convocatòries que faci la Generalitat de Catalunya en el marc del nou programa de barris.	Un vegada analitzades les condicions de la convocatòria realitzada erant que El Masnou no complia els requisits ni els criteris de valoració suficients com per participar-hi. <p>S'estudiaran les possibles convocatòries que es facin.</p>	01/2024	06/2027	01/2024		57%	57%		<input type="checkbox"/>
046	Adquirir pisos per tal de resoldre casos d'emergència social per desnonaments a famílies o persones vulnerables.	Amb posterioritat a la data de finalització de l'acció, la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el 18 de desembre de 2025, va aprovar el compromís d'adquisició d'un nou habitatge ubicat a la promoció d'habitatges amb protecció oficial de la Plaça Nova de les Dones del Tèxtil.	01/2025	12/2026	04/2024	07/2024	50%	100%		<input type="checkbox"/>
